

ANEXO 6 : Lista de los Equipos adquiridos por la prestación

Nº	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	COSTO (Bs.)		FECHA DE ENTREGA		OBSERVACIONES
		PREVISTO	REAL	PREVISTA	REAL	
1	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S9HAXB008144	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
2	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S9HAXB006671	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
3	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S9HAXB007879	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
4	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S9HAXB007883	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
5	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S9HAXB007884	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
6	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
7	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S 9HAXB007883	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
8	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S 9HAXB006672	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
9	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S 9HAXB007884	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
10	Telefonos Inalambricos color negro panasonic 2,4 GHZ digital Mode Nº KX - T 63601LC, N/S: 9HAXB008144	Bs. 500.00	Bs. 388.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
11	GARMIN. Marca GPS MAP, Modelo 60 CSX, N/S 1185811177	Bs. 5,000.00	Bs. 3,499.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra con los técnicos
12	GARMIN. Marca GPS MAP, Modelo 60 CSX, N/S 1185811176	Bs. 5,000.00	Bs. 3,499.00	20-dic-09	20-dic-09	El equipo se encuentra con los técnicos
13	GARMIN. Marca GPS MAP, Modelo 60 CSX, N/S 118548782	Bs. 5,000.00	Bs. 3,499.00	20-dic-09	20-dic-09	Se halla en almacenes
14	GARMIN. Marca GPS MAP, Modelo 60 CSX, N/S 1185811171	Bs. 5,000.00	Bs. 3,499.00	20-dic-09	20-dic-09	Se halla en almacenes
15	Central Telefonica Scanner panasonic KX - TE 5824 Modelo Nº KX TCS 824LA SERIE:98BFN040395	Bs. 4,500.00	Bs. 4,207.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
16	Scanner Jet G3110 0698-64001 CYR 95GA502TL2698-64001 color blanco con plomo	Bs. 2,000.00	Bs. 1,390.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
17	Telefono Panasonic Fax Mod: KX - FT 988 LS 818WA 005066	Bs. 1,500.00	Bs. 1,176.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS
18	Telefono Panasonic Fax Mod: nº KX FT 938LS 768WA 011135	Bs. 1,500.00	Bs. 1,176.00	14-dic-09	14-dic-09	El equipo se encuentra en las oficinas de PROCAPAS

N°	FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EMPRESA SOLICITADA	NOMBRE DEL SUB CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO
19	Computadora negra portátil HPLXWE 8020059372C7FA1601, SNID:97718226616 mas licencia windows Vista 00196-004-854-768 mas Cargador HP S/N639W993127Y, con estuchera negra, Raton color negro optico mod. M0AMUQA-1	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
20	Computadora negra portátil mod S/NCND72016TQ HP mas licencia windows Vista 00144-013*897-511 mas Cargador HP CT. 597950ALLUISN6 con estuchera negra y un Raton color plomo Genius s/n 151358004243	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
21	Computadora negra portátil mod S/NLXW F 8020059383789 E 1601 con estuchera negra Pantalla 17 Procesador Intel Core 2 Duo 2.20 GHZ 400 GB Memoria Ram 450 GB Disco Duro Gateway mas cargador S/N 634 W9940 CIL, licencia Windows p 201,001 (Manuell) y un Raton color negro optico mod. 360 s/n M 363090417754	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
22	Computadora negra portátil mod S/ND 93718239016 con estuchera negra Pantalla 17 Procesador Intel Core 2 Duo 2.20 GHZ 400 GB Memoria Ram 450 GB Disco Duro mas cargador S/N 622 W94AUCP4 mas licencia 00196-004-804-782 Gateway y un Raton color plomo optico S/N 70301115947	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
23	Computadora negra portátil mod S/N 93717796816 con estuchera negra Pantalla 17 Procesador Intel Core 2 Duo 2.20 GHZ 400 GB Memoria Ram 450 GB Disco Duro Gateway mas cargador S/N F1-090919361601 mas licencia 00196-004-173-694 Raton color negro optico mod. Serie 70301115947 y un Raton color negro optico mod. Serie 70301115947	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
24	Computadora negra portátil mod S/ND: 94000531316 con estuchera negra Pantalla 17 Procesador Intel Core 2 Duo 2.20 GHZ 400 GB Memoria Ram 450 GB Disco Duro Gateway mas cargador S/N 622W94AUCP4 mas licencia 00196-013-235-175 (Juan Callahuara) y un Raton color negro optico mod. Genius S/N 159171201457	Bs. 9,000.00	Bs. 8,790.00	24/12/2009 24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS

MARCA Y MODELO DEL EQUIPO		FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	NOMBRE DEL SUBCONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	
25	Computadora negra portatil S/N: 2XWE80200594000AA1601, S/NID: 94000017016, con estuche negro Pantalla 17 Proresador Intel Core 2 Duo 2. 20 GHZ 4GB GB Memoria Ram 4GB Disco Duro Gateway mas cargador s/n 622 W94A0077 mas licencia 00196-313-234-168	Bs. 9,000.00	Bs. 8,750.00	24/12/2009	24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
26	Computadora negra portatil mod S/NLXWE200593840891601HP, S/NID: 93826519316 mas Licencia windows Vista 00196-006-319-574, mas Cargador HP S/N622W94A094A, con estuche negro	Bs. 9,000.00	Bs. 8,750.00	24/12/2009	24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
27	Monitor negro pantalla plana DELL de 17 pulgadas, Servidor Hp proliant ML 110-G5 Proc. Intel X Dual Core 3.00 Lhz Mem 2GB Disco duro 500 G.B cd-Ram	Bs. 9,300.00	Bs. 8,997.00	24/12/2009	24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
28	CPU color negro DELL Power Edge T.110 cod.17C11585801		Bs. 6,500.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
29	Monitor negro pantalla plana SAMSUNG de 17 pulgadas 907 Ncd m8267J 1943 cv	Bs. 7,500.00	Bs. 7,100.00	24/12/2009	24/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
30	CPU color negro super SP power sector LG		Bs. 6,500.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
31	Data Show DELL 12095 Service Tag: 482 TID1 Cod.29456016049	Bs. 5,500.00	Bs. 5,302.50	18/12/2009	18/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
32	Data Show DELL 12095 Service Tag: 482 TID1 Cod.9195596101	Bs. 5,500.00	Bs. 5,302.50	18/12/2009	18/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
33	Data Show DELL 12095 Service Tag: 482 TID1 Cod.9195596101	Bs. 5,500.00	Bs. 5,302.50	18/12/2009	18/12/2009	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
34	Equipo computacion Monitor pantalla plana color negro 17 pulgadas	Bs. 6,000.00	Bs. 5,800.00	24/01/2010	24/01/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
35	Equipo computacion Monitor pantalla plana color negro 17 pulgadas	Bs. 600.00	Bs. 5,800.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
36	CPU color negro AC 220 V. 50Hz A4 procesador 243, 3 G.B disco duro		Bs. 6,500.00	24/12/2010	24/12/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
37	Camara WEB usb digital		Bs. 5,500.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
38	Monitor negro pantalla plana SAMSUNG de 17 pulgadas s/n CM19H9F5734017E 1933 S/N PLUS	Bs. 7,500.00	Bs. 7,100.00	24/12/2010	24/12/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
39	Equipo computacion Monitor pantalla plana color negro de 17 pulgadas Samsung 1943 cv Serie: 907 Ndoa 82444	Bs. 7,500.00	Bs. 7,100.00	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
40	CPU color negro AC 220 V. 50Hz A4 procesador 243, 3 G.B disco duro 500 G.B Encore Dos Duo		Bs. 6,500.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
41	Monitor negro pantalla plana SAMSUNG de 17 pulgadas s/n CM19H9F57350 19 N 433 S/N PLUS	Bs. 7,500.00	Bs. 7,100.00	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS

42	CPU color negro LG S9		Bs. 6.500.00			El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
43	Impresora mediana color crema laser VN C50/5538 Laser HP 1005	Bs. 1.500.00	Bs. 1.400.00	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
44	Impresora color plomo mediana HP Laser Jet p 1505	Bs. 3.000.00	1.852.34	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
45	Impresora Multifuncional Serie: CND 985 mg 8j Mod. GM 2727 NF	Bs. 5.000.00	Bs. 4.479.00	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
46	Impresora Hp Laser Jet 1008 Serie vnm 029069	Bs. 1.400.00	Bs. 1.273.00	21/04/2010	21/04/2010	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
47	Motocicleta completa mediana mas esparras (sierras)STIHL - MS381 made in Brasil 365071324	Bs. 7.500.00	Bs. 5.280.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
48	Motocicleta completa pequeña mas esparras (sierras)STIHL - MS25J made in Brasil 361878649	Bs. 4.000.00	Bs. 3.000.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
49	Motocicleta completa pequeña mas esparras (sierras)STIHL - MS381 made in Brasil 363071326	Bs. 4.000.00	Bs. 3.000.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
50	Motocicleta completa pequeña mas esparras (sierras)STIHL - made in Brasil	Bs. 4.000.00	Bs. 3.000.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
51	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01H14DG, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.500.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
52	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G13E5, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
53	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01H14bE, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
54	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03NM, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
55	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01H14BM, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
56	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01H14DA, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
57	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03QD, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
58	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01H14BS, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
59	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03DM, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
60	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03MO, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en almacenes, para uso de los tecnicos del PROCAPAS
61	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03EO, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6.000.00	Bs. 5.100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en el area rural, para uso de los tecnicos del PROCAPAS

NOMBRE DEL OTORGADO		FECHA DE LICITACION	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	NOMBRE DEL SUBASTANTE CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO
62	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G13CA, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6,000.00	Bs. 5,100.00	05-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en el área rural, para uso de los técnicos del PROCAPAS
63	Motopulverizadores Cifarelli (volchera), 27058 (Italia), mod. L3VA, N° 01G03QC, Massa a Vuoto Kg 11.2	Bs. 6,000.00	Bs. 5,100.00	06-sep-10	06-sep-10	El equipo se halla en el área rural, para uso de los técnicos del PROCAPAS
64	Router inalámbrico D' Link	Bs. 500.00	Bs. 424.00	21-abr-10	21-abr-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
65	Router inalámbrico D' Link	Bs. 500.00	Bs. 485.00	21-abr-10	21-abr-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
66	Camara Digital Sony Mod: dsc-w350 : n/s: 8418366	Bs. 2,200.00	Bs. 2,085.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
67	Camara Digital Sony Mod: dsc-w350 : n/s: 8405187	Bs. 2,200.00	Bs. 2,085.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
68	Camara Digital Sony Mod: dsc-w350 : n/s: 8304450	Bs. 2,200.00	Bs. 2,085.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
69	Camara Digital Sony Mod: dsc-w350 : n/s:	Bs. 2,200.00	Bs. 2,085.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
70	Camara Digital Sony Mod: dsc-w350 : n/s:	Bs. 2,200.00	Bs. 2,085.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
71	Video Filmadora marca: sony: Mod: DCR- s-68 : n/s 55G 4-170-818-C1	Bs. 5,000.00	Bs. 3,959.00	13-ago-10	13-ago-10	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
72	Lector para control de asistencia y de acceso Red de alta velocidad 100M	Bs. 3,000.00	Bs. 2,900.00	15/03/2011	15/03/2011	El equipo se encuentra en secretaría de. PROYECTO
73	Firewall Router S8X-100B	Bs. 8,000.00	Bs. 8,000.00	06/04/2012	06/04/2012	El equipo se encuentra en secretaría del PROYECTO
74	Equipo de computación portátil Mini HP Mod 210 LA/disco duro 320 GB RAM 2 Gb	Bs. 27,000.00	Bs. 26,950.00	15/04/2011	15/04/2011	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
75	Impresoras 1102 W	Bs. 5,000.00	Bs. 4,870.00	15/04/2011	15/04/2011	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
76	Impresoras a color con toner 1025	Bs. 3,200.00	Bs. 3,150.00	07/12/2011	07/12/2011	Se encuentra en almacenes, para el uso de Resp. De activos Fijos
77	Reloy Digital de pared	Bs. 150.00	Bs. 100.00	30/06/2011	30/06/2011	El equipo se encuentra en secretaría del PROYECTO
78	Impresora IP 2700	Bs. 330.00	Bs. 455.00	07/07/2011	07/07/2011	El equipo esta fuera de servicio, se encuentra en almacenes
79	Sistema continuo MP 250	Bs. 400.00	Bs. 315.00	07/07/2011	07/07/2011	El equipo se encuentra en almacenes
80	Motosierra MS 381	Bs. 5,500.00	Bs. 5,280.00	06/09/2011	06/09/2011	El equipo se encuentra en almacenes
81	Motosierra MS 250	Bs. 9,200.00	Bs. 9,000.00	06/09/2011	06/09/2011	El equipo se encuentra en las oficinas del PROCAPAS
82	Impresora Laser Jet P1102W	Bs. 4,000.00	Bs. 3,402.00	07/12/2011	07/12/2011	
83	Despulpadoras de frutas DES-50	Bs. 12,000.00	Bs. 11,565.52	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
84	Mostrador refrigerado	Bs. 18,000.00	Bs. 17,332.36	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
85	Envasadores al vacío	Bs. 22,000.00	Bs. 20,044.50	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes

DENOMINACIÓN DEL BIEN		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	NOMBRE DEL SUBASTANTE	OBJETO DEL CONTRATO
86	Sello para sacos de bolsas	Bs. 10,000.00	Bs. 9,876.24	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
87	Fecha dor termico	Bs. 7,000.00	Bs. 6,932.26	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
88	Frezer vertical	Bs. 20,000.00	Bs. 19,960.00	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
89	Maquina de coser sacos portatil	Bs. 3,000.00	Bs. 2,450.00	28/12/2011	28/12/2011	El equipo se encuentra en almacenes
90	Cacioneta de 4 ruedas, modelo 2010, marca NISSAN, Tipo Frontier, Cilindrada 2389 4479, Consb. Gasolina ORIGEN Japon, Color Blanco, n° de serie UGN11A7Y615RBARFDA, TB45-113773, N° chasis JN1UBLY61200005000,	Bs. 200,272.00	Bs. 209,273.00	01/09/2010		Motorizados se encuentra en la Institucion
91	Camioneta de 4 ruedas, modelo 2010, marca NISSAN, Tipo Patrol Cilindrada 4479, Consb. Gasolina ORIGEN Japon, Color Dorado, n° de serie C6GULCFD22EWNA7AWG, N1° motor KA24 8075592, N° chasis JN1CD11D222C041526	Bs. 159,075.00	Bs. 159,075.00	01/09/2010		Motorizados se encuentra en la Institucion
92	Motocicleta, marca HONDA, tipo CTX200, modelo 2009, color Rojo, origen Brasil, Cilindrada 197, N° de Chasis 9C2MD35U09R002608 N° N° de Motor, MD28EU9J02608	Bs. 32,000.00	Bs. 32,000.00	01/09/2010		Motorizados se encuentra en la Institucion
93	Motocicleta, marca HONDA, tipo CTX200, modelo 2009, color Rojo, origen Brasil, Cilindrada 197, N° de Chasis 9C2MD35U09R002572 Motor MD28EU9J002572.	Bs. 32,000.00	Bs. 32,000.00	01/09/2010		Motorizados se encuentra en la Institucion
94	Motocicleta, marca HONDA, tipo CTX200, modelo 2009, color Rojo, origen Brasil, Cilindrada 197, N° de Chasis 9C2MD35U09R002598	Bs. 32,000.00	Bs. 32,000.00	01/09/2010		Motorizados se encuentra en la Institucion
95	Extintidor de 2 kilos	Bs. 300.00	Bs. 280.00	13/03/2012	13/03/2012	El equipo se encuentra en Almacenes
96	Extintidor de 2 kilos	Bs. 300.00	Bs. 280.00	13/03/2012	13/03/2012	El equipo se encuentra en Almacenes
97	Disco externo de 500 GB (bacap)	Bs. 1,000.00	Bs. 962.00	14/03/2012	14/03/2012	El equipo se encuentra en Almacenes
98	Disco externo de 500 GB (bacap)	Bs. 1,000.00	Bs. 962.00	14/03/2012	14/03/2012	El equipo se encuentra en poder del Ing. Marco
99	Disco externo de 1 Terabyte (bacap)	Bs. 1,500.00	Bs. 1,239.00	24/04/2012	24/04/2012	El equipo se encuentra en Almacenes
100	Disco externo de 1 Terabyte (bacap)	Bs. 1,500.00	Bs. 1,239.00	24/04/2012	24/04/2012	El equipo se encuentra en poder del Lic. Agustín
101	Caja de seguridad	Bs. 1,000.00	Bs. 850.00	25/04/2012	25/04/2012	El equipo se encuentra en la Unidad de Administración

ITEM N° DESCRIPCIÓN		PRECIO DE INCHACÓN	PRECIO DE ENTREGA DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	NOMBRE DEL SUB CONTRATANTE	UBICACIÓN DEL CONTRATO	
102	Computadora portátil de 17" de última generación marca DELL Inspiron n7110, Intel Core i7, mas cargador, mochila, mouse	Bs. 10,000.00	Bs. 9,605.00		10/07/2012	10/07/2012	El equipo se encuentra en poder del Ing. Marco
103	Computadora portátil de 15.6" de última generación marca THOSHIBA Satellite P755-SS120, Intel Core i7-2670QM, procesador 2.2 Ghz, mas cargador, mochila, mouse	Bs. 10,000.00	Bs. 9,361.00		10/07/2012	23/07/2012	El equipo se encuentra en poder del Ing. Ruben Polo
104	Escáner plano digital HP ScanJet 5990 mas cable USB	Bs. 4,000.00	Bs. 3,495.00	10/07/2012	10/07/2012		El equipo se encuentra en poder del Lic. Agustín
105	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		el equipo se encuentra en poder del Ing. Efraín
106	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		El equipo se encuentra en poder del Ing. Humberto
107	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		El equipo se encuentra en poder del Ing. Jorge
108	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		El equipo se encuentra en poder del Ing. Alvaro
109	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		El equipo se encuentra en poder el Ing. Gustavo
110	Cámaras digitales de marca NIKON de 16 megapíxeles, de 7X zoom S6100, memoria de 4 GB y estuche.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,390.00	23/07/2012	23/07/2012		El equipo se encuentra en Almacenes
111	Lavadora de zanahoria	Bs. 47,500.00	Bs. 48,800.00	24/08/2012	24/08/2012		La maquina se encuentra en la comunidad de Tasapampa para efectos de ser transferidos
112	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder Ing. Efraín
113	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder Ing. Humber
114	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder Ing. Jorge
115	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder Ing. Alvaro
116	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder del Ing. Gustavo
117	GPS Garmin etrex 30	Bs. 3,500.00	Bs. 3,208.00	21/08/2012	21/08/2012		El equipo se encuentra en poder del Ing. Gabino
118	Escáner industrial	Bs. 15,000.00	Bs. 14,345.00	22/08/2012	22/08/2012		Se encuentra en transito por la Unidad de Administración
Total:		Bs. 143,009.00	Bs. 140,903.50				

Anexo 7. Capacitaciones

Clase de capacitación	País, Institución, Duración	Nombre Número de personas capacitadas	Fechas de capacitación	Tema, contenido y nivel
Pasantía				
Taller				
Otros				

**EVALUACION
SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA
DE CADENAS AGRICOLAS
SOSTENIBLES

PROCAPAS.**

**• EVALUACION DE
COMPONENTES Y
ACTIVIDADES
QUE
DESARROLLO EL
PROCAPAS.**

las Líneas estratégicas del Programa para ser evaluadas socioeconómicamente.

- el incremento de la productividad y producción de frutas y hortalizas mediante el manejo integral de cultivos,
- el incremento del acceso al agua para riego,
- el incremento de la productividad, calidad e inocuidad de los productos hortícolas y frutícolas de modo que respondan a las exigencias de mercado y
- el fortalecimiento de la organización de los pequeños productores para mejorar sus capacidades de negociación con otros actores de las cadenas de los productos

• **EVALUACION DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLO EL PROCAPAS.**

- Para efectos prácticos de la consultoría de evaluación se puede establecer que el ámbito de acción del Programa PROCAPAS ha sido variado y extenso, sin embargo, no existe una certeza del alcance poblacional de los beneficiarios.
- Se definieron y ajustaron los tamaños de la muestra de estudio considerando las siguientes comunidades como las mas representativas

Yacaré	Buridá	
Tesa Parroquia	Kompunen Alto	06. Tulumá
Saninayú	Luje	07. Zúñiga, Monte Reyos
Tirreñes	La Glasa	08. Peto, Guadalupe
Chauca Molina	Sekro	
	Pojos	
	Chistón	
	Ku Ika	

• **EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL DEL PROCAPAS.**

Incidencia en los Ingresos y fuentes de financiamiento

Se ha podido verificar un desplazamiento en los niveles de ingresos mensuales bajos situándolos en un nivel intermedio promedio en 1.500 Bs./mes

Con un impacto como el se muestra a continuación

	Antes	Después	Impacto
1. Ingresos mensuales	228.22	308.12	55.5%
2. Ingresos familiares	447.97	260.38	64.1%
3. Ingresos anuales	275.05	435.82	65%

Resultados de la Evaluación de las condiciones de intervención productiva del PROCAPAS.



El diagnóstico económico productivo toma en cuenta e integra información agropecuaria de la Provincia Oropeza, además de información sobre tipos de sistemas de producción, sondeos de mercado, y temas sectoriales como situación de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, encadenando el comportamiento de la producción al desarrollo de factores.

El Programa de manera inicial identificó las siguientes especies:

Especie	Unidad
Tomate	Tonelada
Peperón	Tonelada
Repollo	Mediana
Lechuga	Tonelada
Calabaza	Tonelada
Chirimoya	Pala
Pimentón	Chacra
Tipa, cebolla, zanahoria, ajo	kg

finalmente 8 productos son priorizados: tomate, cebolla verde, pimentón, zanahoria, durazno, chirimoya, palto, mango, de acuerdo a la recomendación de la Evaluación de Medio Término.

¿Cuál es la principal especie de HORTALIZA que tiene en su parcela?



¿A quién vende?



¿Cuál es la principal especie de fruta que tiene en su parcela?




Impacto en los principales indicadores

La aplicación del indicador NRI al programa permite definir los componentes de evaluación antes y después de la intervención de PROCAPAS:




Las mediciones relativas a la metodología INSE que refleja la situación de bienestar de las personas dentro de un hogar y una aplicación modificada de la metodología de cálculo del IDH municipal muestran:



Impacto en los principales indicadores

Para efectos de evaluar el impacto del Programa sobre la condición de pobreza y pobreza extrema de la población beneficiaria, se adoptó las definiciones empleadas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio para ambos conceptos

Municipio	Valor de IDH (2007)	Potencial Nuevo IDH	Pobreza
San Juan	0.6565800	0.7123009	80%
San Juan	0.64961784	0.6416474	14%
Barahona	0.375099545	0.451459945	55%



Proyecto de Ley 10.620

Análisis del costo de los impactos				
Impacto	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
Impacto 1	...	...	...	...
Impacto 2	...	...	...	...
Impacto 3	...	...	...	...
Impacto 4	...	...	...	...
Impacto 5	...	...	...	...
Impacto 6	...	...	...	...
Impacto 7	...	...	...	...
Impacto 8	...	...	...	...
Impacto 9	...	...	...	...
Impacto 10	...	...	...	...
Impacto 11	...	...	...	...
Impacto 12	...	...	...	...
Impacto 13	...	...	...	...
Impacto 14	...	...	...	...
Impacto 15	...	...	...	...
Impacto 16	...	...	...	...
Impacto 17	...	...	...	...
Impacto 18	...	...	...	...
Impacto 19	...	...	...	...
Impacto 20	...	...	...	...
Impacto 21	...	...	...	...
Impacto 22	...	...	...	...
Impacto 23	...	...	...	...
Impacto 24	...	...	...	...
Impacto 25	...	...	...	...
Impacto 26	...	...	...	...
Impacto 27	...	...	...	...
Impacto 28	...	...	...	...
Impacto 29	...	...	...	...
Impacto 30	...	...	...	...
Impacto 31	...	...	...	...
Impacto 32	...	...	...	...
Impacto 33	...	...	...	...
Impacto 34	...	...	...	...
Impacto 35	...	...	...	...
Impacto 36	...	...	...	...
Impacto 37	...	...	...	...
Impacto 38	...	...	...	...
Impacto 39	...	...	...	...
Impacto 40	...	...	...	...
Impacto 41	...	...	...	...
Impacto 42	...	...	...	...
Impacto 43	...	...	...	...
Impacto 44	...	...	...	...
Impacto 45	...	...	...	...
Impacto 46	...	...	...	...
Impacto 47	...	...	...	...
Impacto 48	...	...	...	...
Impacto 49	...	...	...	...
Impacto 50	...	...	...	...
Impacto 51	...	...	...	...
Impacto 52	...	...	...	...
Impacto 53	...	...	...	...
Impacto 54	...	...	...	...
Impacto 55	...	...	...	...
Impacto 56	...	...	...	...
Impacto 57	...	...	...	...
Impacto 58	...	...	...	...
Impacto 59	...	...	...	...
Impacto 60	...	...	...	...
Impacto 61	...	...	...	...
Impacto 62	...	...	...	...
Impacto 63	...	...	...	...
Impacto 64	...	...	...	...
Impacto 65	...	...	...	...
Impacto 66	...	...	...	...
Impacto 67	...	...	...	...
Impacto 68	...	...	...	...
Impacto 69	...	...	...	...
Impacto 70	...	...	...	...
Impacto 71	...	...	...	...
Impacto 72	...	...	...	...
Impacto 73	...	...	...	...
Impacto 74	...	...	...	...
Impacto 75	...	...	...	...
Impacto 76	...	...	...	...
Impacto 77	...	...	...	...
Impacto 78	...	...	...	...
Impacto 79	...	...	...	...
Impacto 80	...	...	...	...
Impacto 81	...	...	...	...
Impacto 82	...	...	...	...
Impacto 83	...	...	...	...
Impacto 84	...	...	...	...
Impacto 85	...	...	...	...
Impacto 86	...	...	...	...
Impacto 87	...	...	...	...
Impacto 88	...	...	...	...
Impacto 89	...	...	...	...
Impacto 90	...	...	...	...
Impacto 91	...	...	...	...
Impacto 92	...	...	...	...
Impacto 93	...	...	...	...
Impacto 94	...	...	...	...
Impacto 95	...	...	...	...
Impacto 96	...	...	...	...
Impacto 97	...	...	...	...
Impacto 98	...	...	...	...
Impacto 99	...	...	...	...
Impacto 100	...	...	...	...

Análisis financiero social

- Se realizó una proyección de las hectáreas efectivas de cultivo que a la fecha de la campaña 2010-2011 tomando en cuenta los datos proporcionados en el documento DTF modificado en fecha 03/07/2009.
- La tasa de crecimiento se estima de las áreas cultivadas dependerá de las condiciones técnicas que los beneficiarios posean y de los diversos programas de apoyo que puedan o sígan recibiendo
- Los resultados presentados se basan en una simulación que considera el potencial proceso de cultivo que se podría tener en las áreas beneficiarias para los siguientes 10 años.
- Se ha considerado dos escenarios:



¿Cuál es el resultado de los indicadores de evaluación financiera considerando rendimientos, costos promedio y factores definidos Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para RPC mano de obra no calificada rural (precio sombra) de 0.47; el valor de tasa de corte social de 12.67% y una tasa de corte para inversiones privadas del tipo PyME's de 12 %, si SOLO se aplica el total presupuestado por el Programa que es de Bs 35,879,150.7



¿Cuál es el resultado de los indicadores de evaluación financiera considerando rendimientos, costos promedio y factores definidos Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para RPC mano de obra no calificada rural (precio sombra) de 0.47; el valor de tasa de corte social de 12.67% y una tasa de corte para inversiones privadas del tipo PyME's de 12 %, aplicando SOLO el total ejecutado por el Programa al 30 de Septiembre de 2012 que es de Bs 20,000,826.71?

Análisis financiero social

Resultados con el Primer escenario

Indicadores Socioeconómicos - Inversión
presupuestada

PA	10.000.000
PI	500.000
PI	100.000.000
PI	100.000.000

PA	10.000.000
PI	500.000
PI	100.000.000
PI	100.000.000

Indicador	1	2	3	4
Indicador	1	2	3	4

Indicador	1	2	3	4
Indicador	1	2	3	4

Análisis financiero social

Resultados con el Segundo escenario

Indicadores Socioeconómicos - Inversión Ejecutada

PA	10.000.000
PI	500.000
PI	100.000.000
PI	100.000.000

PA	10.000.000
PI	500.000
PI	100.000.000
PI	100.000.000

Indicador	1	2	3	4
Indicador	1	2	3	4

Indicador	1	2	3	4
Indicador	1	2	3	4

Evaluación de la eficacia

Aunque la valoración es subjetiva teniendo en cuenta los antecedentes recolectados la tabla permite determinar la eficacia presentada por el proyecto,

Objetivo General	Objetivo específico	RESULTADOS		PUNTO
		Logros	Logros	
Contribución al mejoramiento de ingresos y empleo de la población en zona de influencia	Incremento de la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	80
		Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	80
		Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	80
		Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	80
	Incremento de la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	Se incrementó la productividad y eficiencia en la producción de los cultivos de la zona de influencia.	80
PROMEDIO GENERAL				80

ANÁLISIS PROSPECTIVO MICMAC DEL PROGRAMA PROCAPAS

Jerarquización de Factores Externos

los factores externos que más han pesado en los resultados del programa son los siguientes

EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
POBREZA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
ELEVADA PRECIPITACIÓN DE LOS RÍOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
FALTA DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
FALTA DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
FALTA DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
FALTA DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA
FALTA DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA

Jerarquización Factores Internos

los factores internos que más han pesado en los resultados de programa son los siguientes

PROCAPAS CONTINUA CON LA DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS
FALTA DE REGULARIDAD EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS

PROYECTO P



BTC

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PROGRAMA DE CADENAS AGRÍCOLA PRODUCTIVAS SOSTENIBLES PROCAPAS



11/11/2012



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



PROCAPAS


OBJETIVOS


- Desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica SIG, para el proyecto PROCAPAS, a través del procesamiento y sistematización de la información de las Intervenciones del proyecto en la región y cartografía georeferenciada, que permita la difusión de los resultados del proyecto.
 - ▣ Base de Datos Sistematizada del Proyecto
 - ▣ Sistema de Información Geográfica del Proyecto
 - ▣ Instrumentos de Difusión del Proyecto

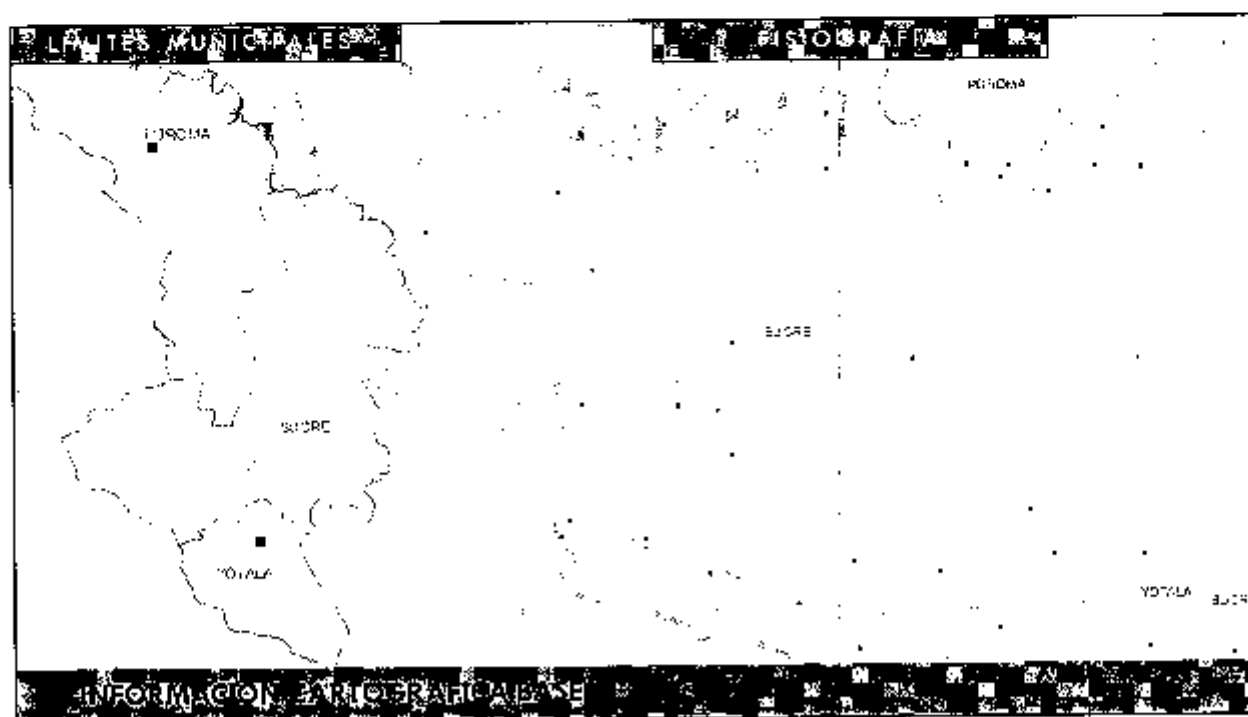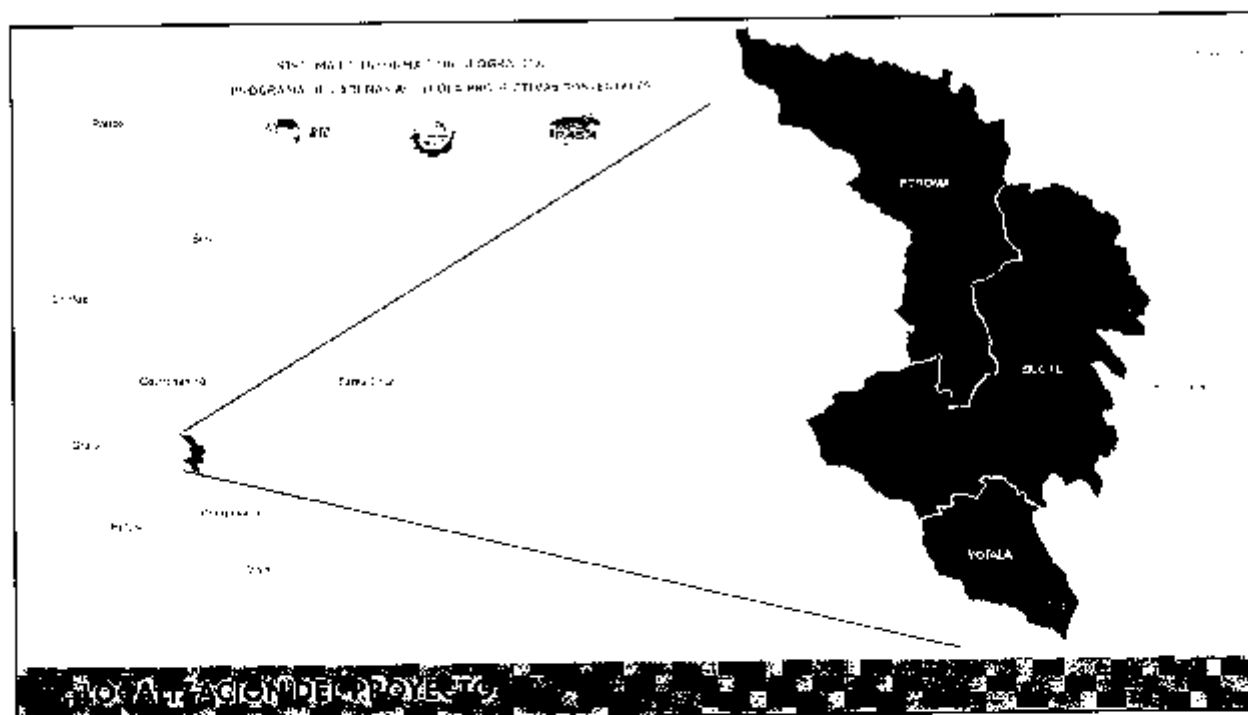

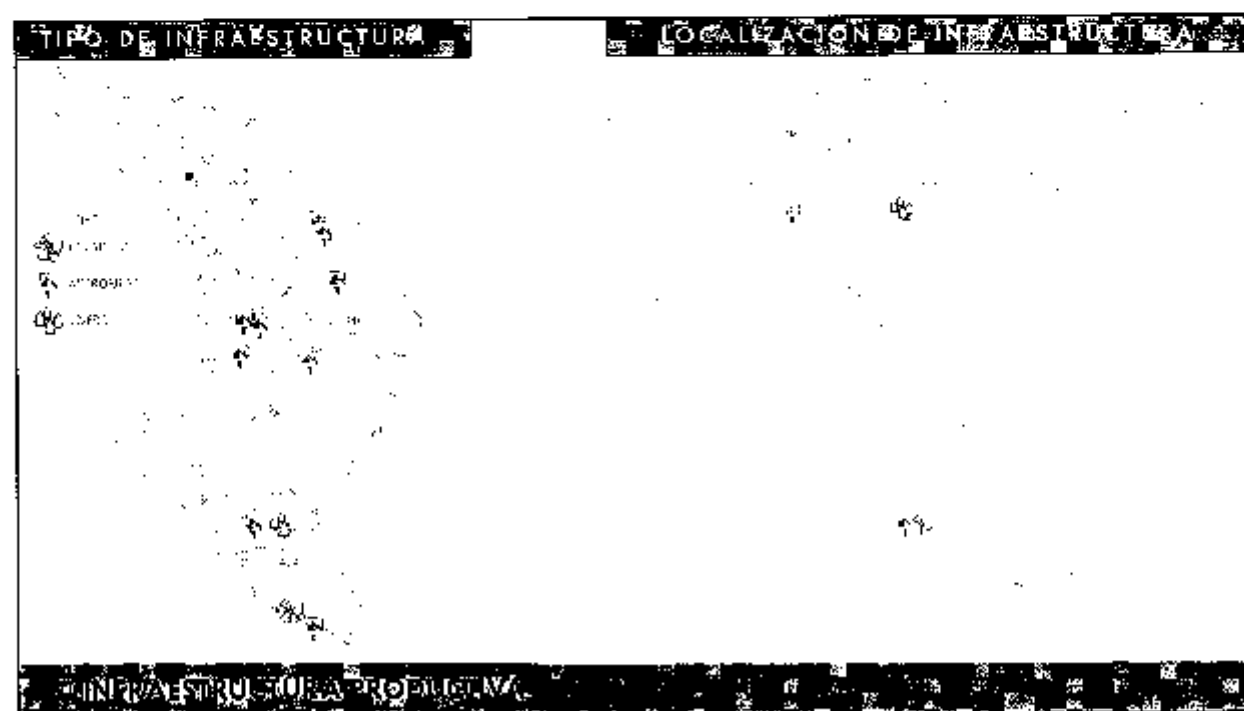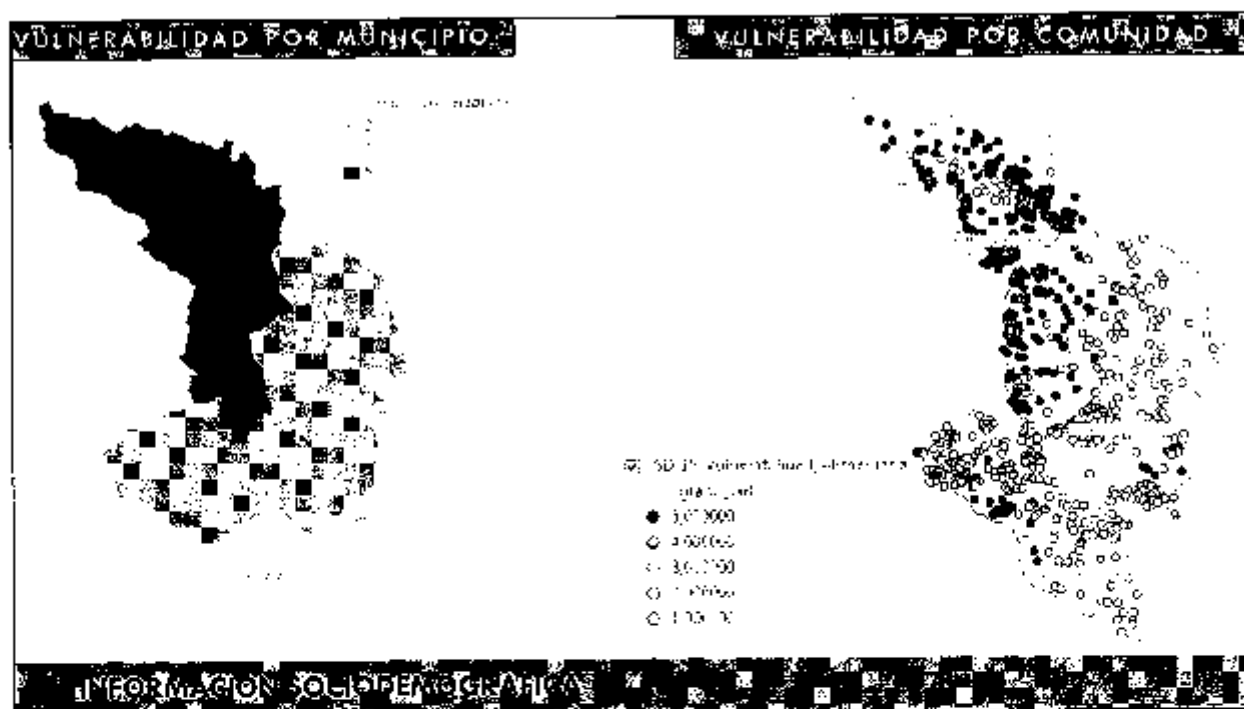

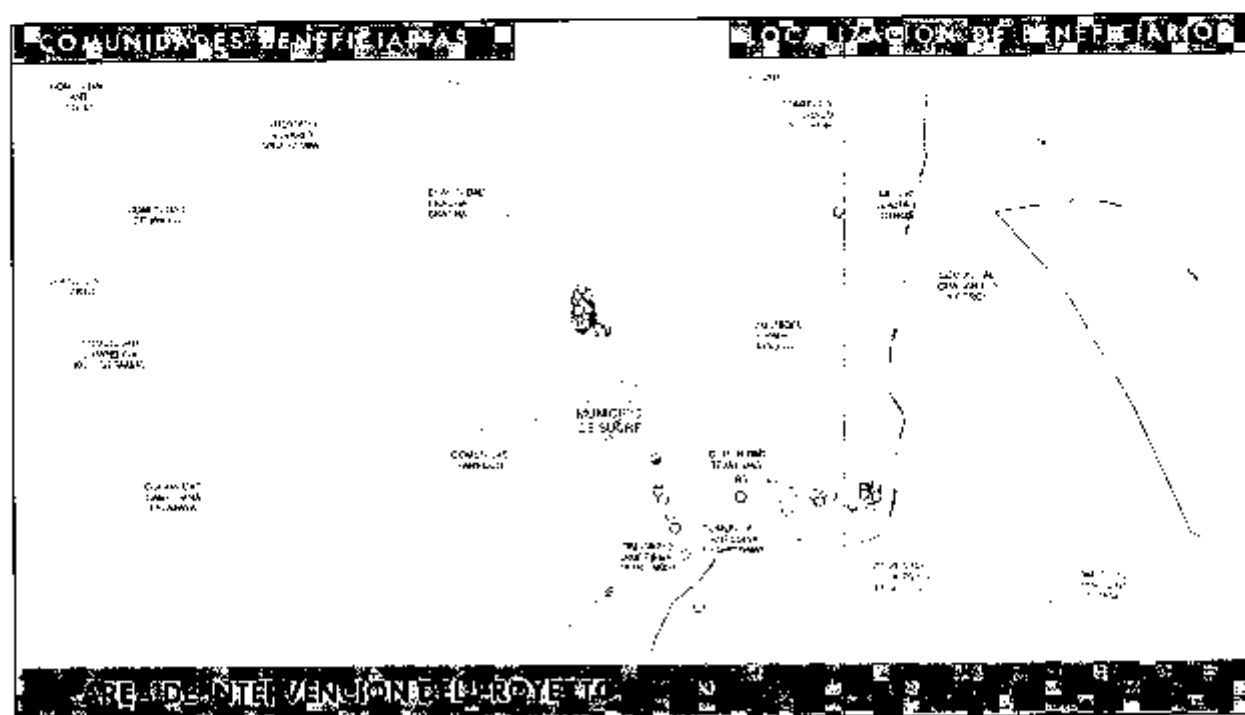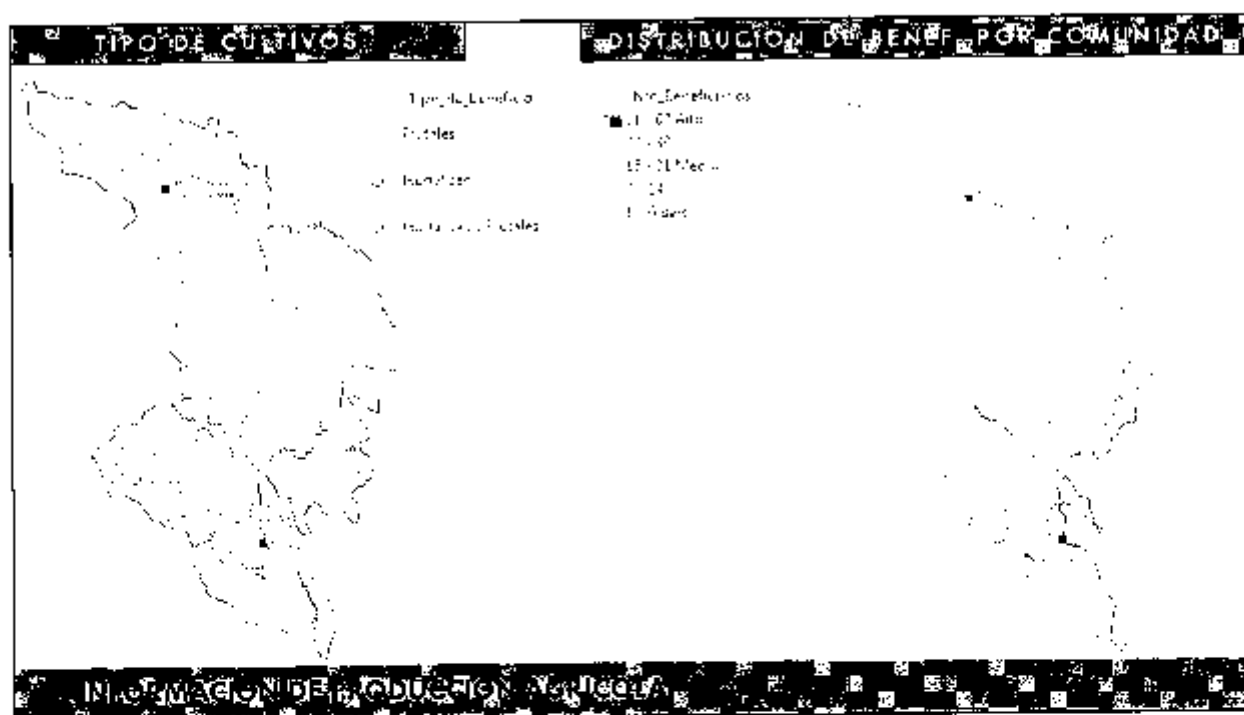

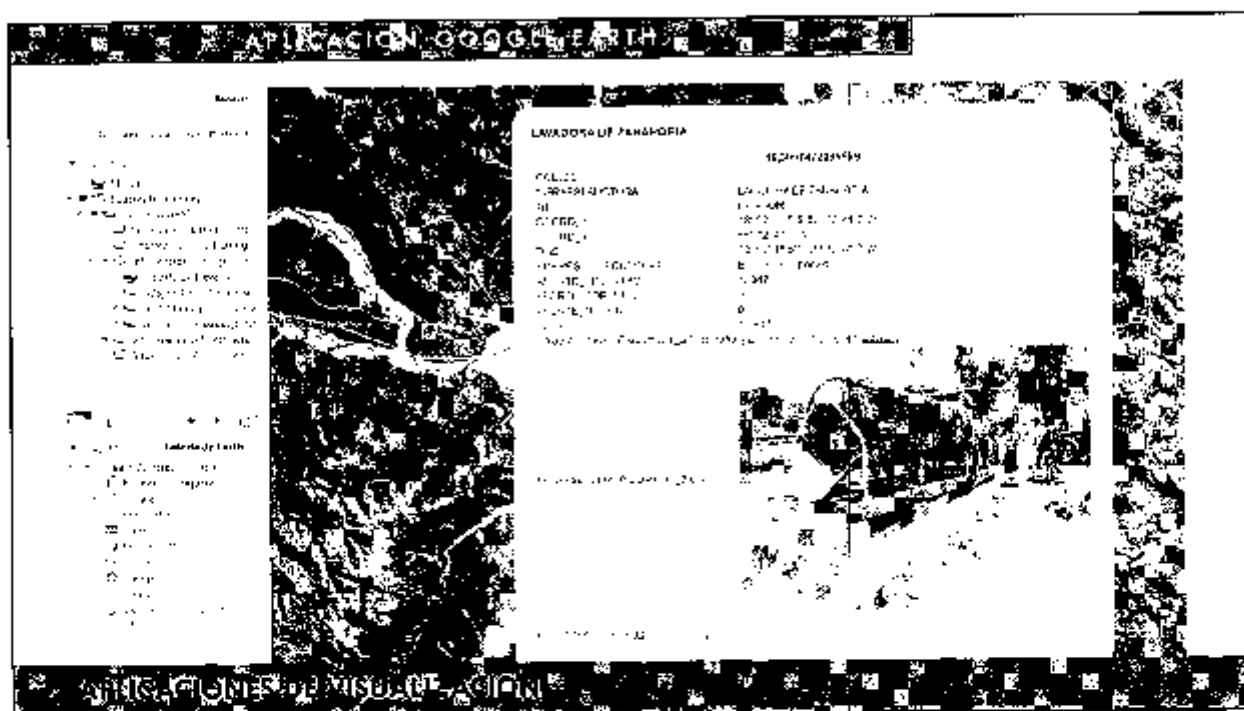

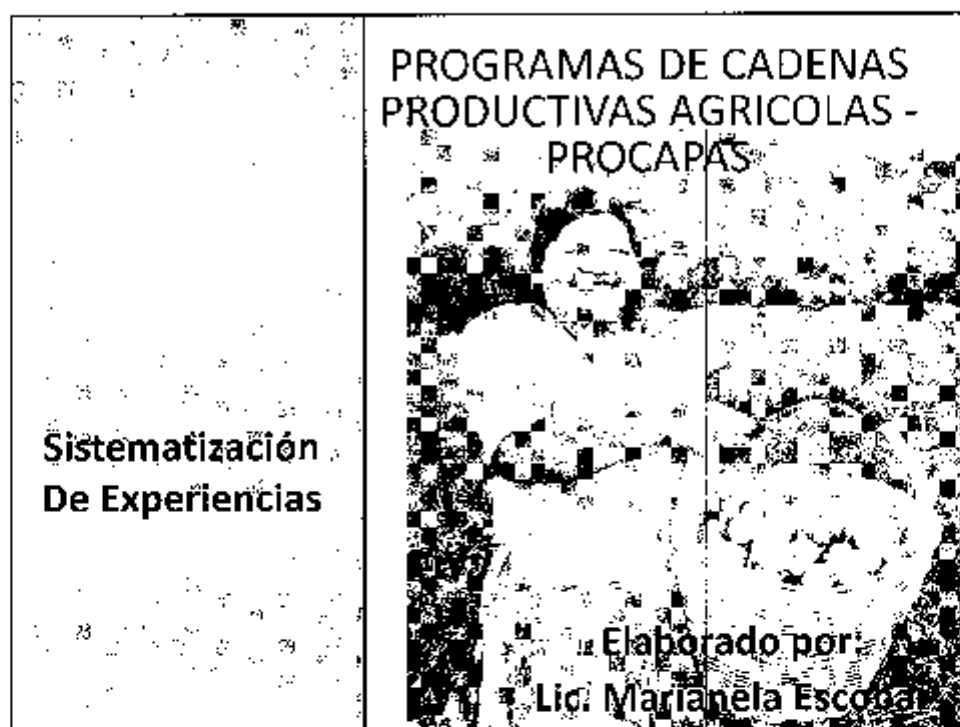






PRESENTACION

Presentación


- En los capítulos de la sistematización se podrá observar cómo se ha logrado el cambios en la vida de agricultores de las comunidades más pobres del departamento, relatados a través de la voz de sus beneficiarios directos, productores y productoras de cultivos horto-frutícolas de los Municipios de Sucre, Porema y Yotala.
- Relata las experiencias vividas en cuyas lecciones aprendidas es posible encontrar soluciones y prácticas más eficientes con la visión de brindar más y mejores oportunidades de desarrollo al país.
- Esta sistematización de experiencias es el resultado de un proceso de aprendizaje concebido entre los integrantes del programa PROCAPAS, y la recolección documental y testimonial de los actores que han formado parte de esta experiencia.





CONTEXTO

- Contexto Geográfico: Ubicación geográfica del PROCAPAS en la provincia y municipios.
- Contexto Político: Rol del programa, legislación que la sustenta
- Contexto Sectorial: Identificación del programa de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y Política Sectorial
- Contexto demográfico: Descripción de los beneficiarios
- Contexto Institucional: Marco bajo el cual trabajó el PROCAPAS





OBJETIVOS PROCAPAS


- **General:** Coadyuvar al incremento de ingresos y empleo de la población rural de la provincia Oropeza
- **Específico:** "Incrementar el volumen de venta de hortalizas y frutas, el margen de utilidad y diferenciar el producto por calidad".
- Cinco resultados: productividad, sistema de riego, inocuidad de productos, creación de alianzas, y eficiencia del programa.

IMPLEMENTACIÓN

- Metodología: bajo lineamientos del DTF
- Instrumentos: Asistencias técnicas, Capacitaciones, Infraestructura, y Fondos de sostenimiento.
- Temas transversales: Equidad de género, Economía Social, y Medio Ambiente.
- Componentes PROCAPAS: Producción y Extensión, Infraestructura y obras, y Fortalecimiento.

RESULTADOS

- 34 comunidades han participado de las Escuelas de Campo en los municipios de Yotala y Sucre Rural
- 1952 Familias beneficiadas
- 405 hectáreas de producción
- 100 organizaciones de productores están capacitados en la elaboración de abonos orgánicos






RESULTADOS



- Entrega de bienes que alcanzan a Bs. 3,649,846
- Se distribuyen, 350 arados reversibles , 24 rastras a tracción animal, 1800 quintales de fertilizantes en las 100 organizaciones de productores, 800 mochilas fumigadoras y 566 insufladores para mejorar las prácticas agrícolas
- Productores aplican la fertilización de sus árboles frutales, están capacitados en la elaboración de abonos orgánicos, elaboran y aplican fertilización orgánica en horticultura





RESULTADOS




- Se ha construido y supervisado infraestructura de cuatro sistemas de riego en las comunidades participantes, con un total de 29.33 hectáreas que se han incorporado a su producción.
- Se han mejorado con obras nueve sistemas de riego y un total de 173.3 hectáreas





RESULTADOS



- Productores adquieren conocimientos sobre selección y clasificación, utilizan herramientas e instrumentos para la clasificación y selección de productos, así como recipientes adecuados para el transporte de frutas y hortalizas.



- 8 productos (tomate, pimentón, cebolla, zanahoria, chirimoya, papaya, palta, durazno y manga) son reconocidos en el mercado local





RESULTADOS



- Productos priorizados fueron presentados en tres ferias municipales (Yotala, Poroma y Sucre), una feria de la provincia y una nacional (seguridad alimentaria con soberanía de la feria de la OEA).





RESULTADOS



- 1,157 productores han sido capacitados en comercialización asociada y gestión empresarial
- 36 organizaciones de productores logran alianzas comerciales con otros actores del mercado y 170 productores afiliados a las organizaciones están capacitados en liderazgo y manejo administrativo.
- Se han comercializado 254 toneladas año de productos hortofrutícola en el mercado departamental (tomate, zanahoria, cebolla, papaya) con un incremento de utilidad del 20% en dichos productos.







RESULTADOS



- 25 toneladas de productos priorizados en nichos de mercado identificados permiten un margen de utilidad de orden de hasta un 25% o más.

PROCAPAS ha realizado un “Estudio de Inteligencia comercial” y un “Estudio de nichos de Mercado”, para mejorar la comercialización de los productos priorizados.







LECCIONES APRENDIDAS

(Faint text in the left column, likely bleed-through from the reverse side)

- Burocracia Administrativa:
- Largos procesos de trámites (licitaciones, adquisiciones u otros)
- Estructura muy centralizada con dependencia en la UD-PASA
- Demora en los contratos técnicos, por lo tanto, en las actividades
- Desaliento en los beneficiarios
- Procesos técnicos, administrativos y financieros demoran en adaptarse





LECCIONES APRENDIDAS


(Faint text in the left column, likely bleed-through from the reverse side)

- Alta Rotación del Personal
- Contratos anuales que no garantiza la continuidad de trabajo
- Inseguridad en empleados e inestabilidad
- Incrementar el seguimiento
- Seguimiento continuo a las Ats
- Seguimiento a contrapartes





LECCIONES APRENDIDAS



- Buscar mayores Impactos
- Comunidades con extrema pobreza no garantiza altos impactos
- Prácticas productivas a mayor escala
- Mecanismos de monitoreo y evaluación
- Establecer desde el inicio del programa para reflejar un trabajo ordenado con resultados verificables
- Capacitación continua, para técnicos






MEJORES PRÁCTICAS






- Enfoque acertado y fue diseñado con una lógica de integralidad que abarcaba varios componentes
- Valoración de AT dentro de sus propias parcelas y permanencia de técnicos en el área de intervención
- Tecnificación de la producción a través de la dotación de insumos y plantines
- Sistema de contrapartes ha sido efectivo en las comunidades
- Procesos de contratación por competencia y consultorías externas efectivos (ECAs)







GRACIAS...





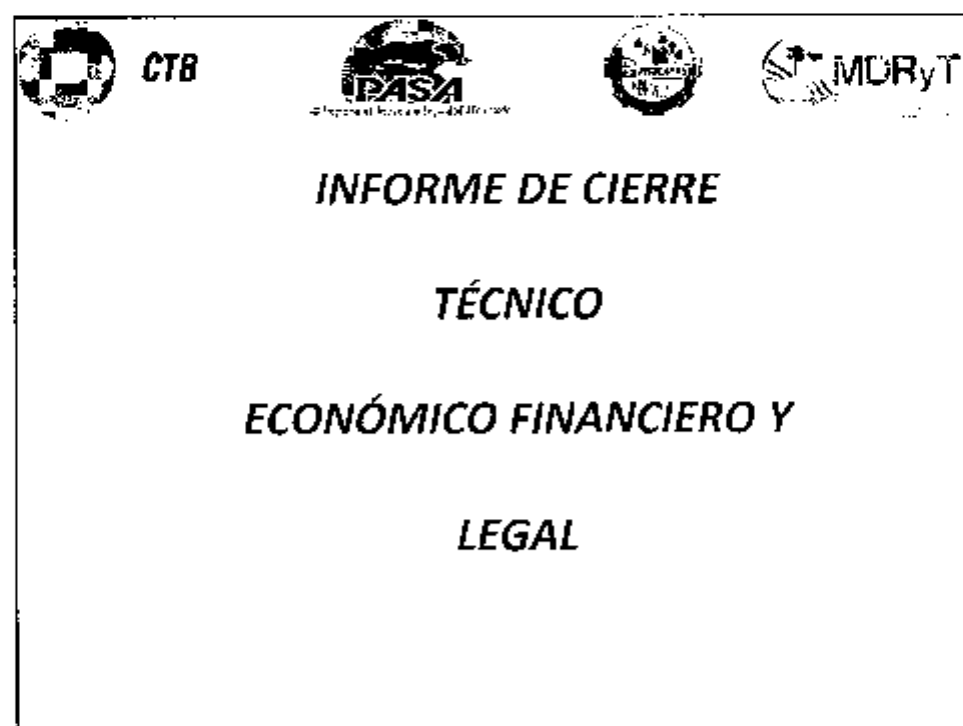
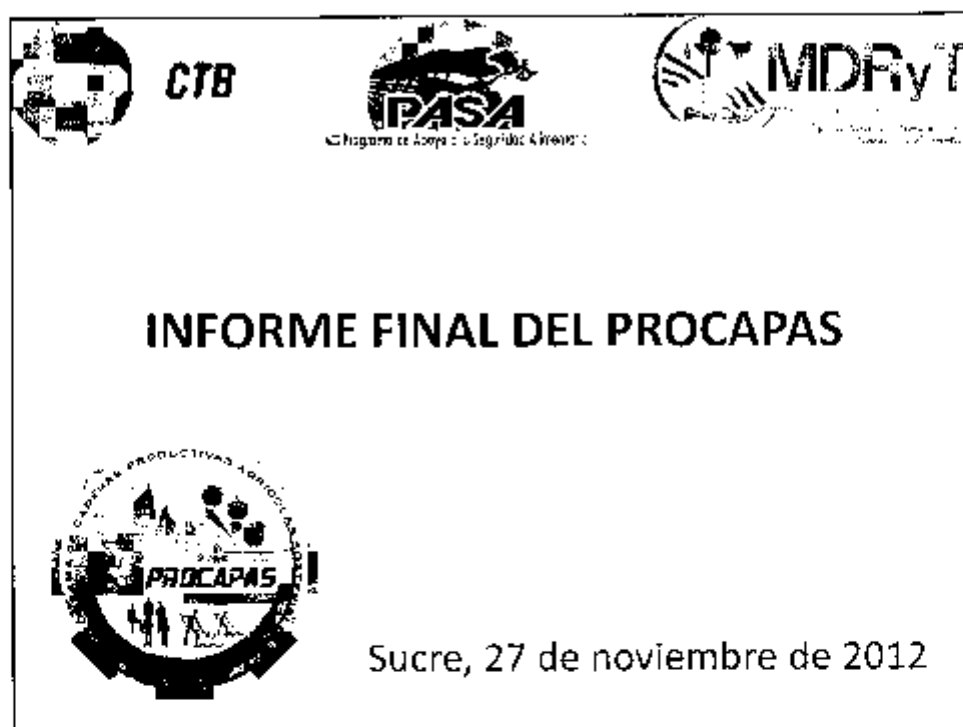



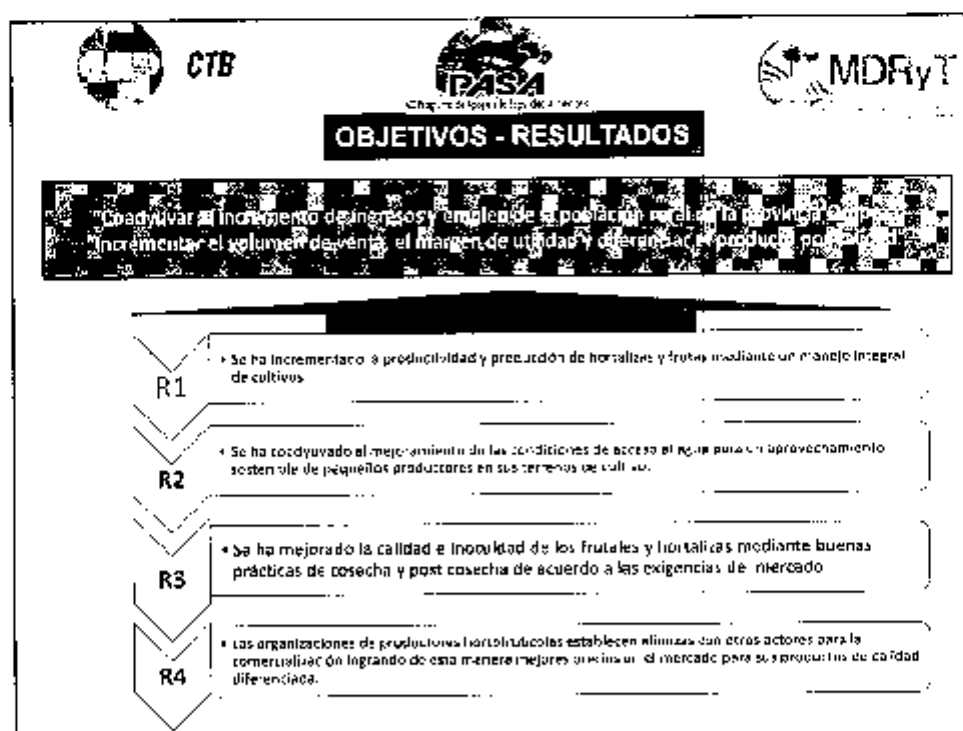


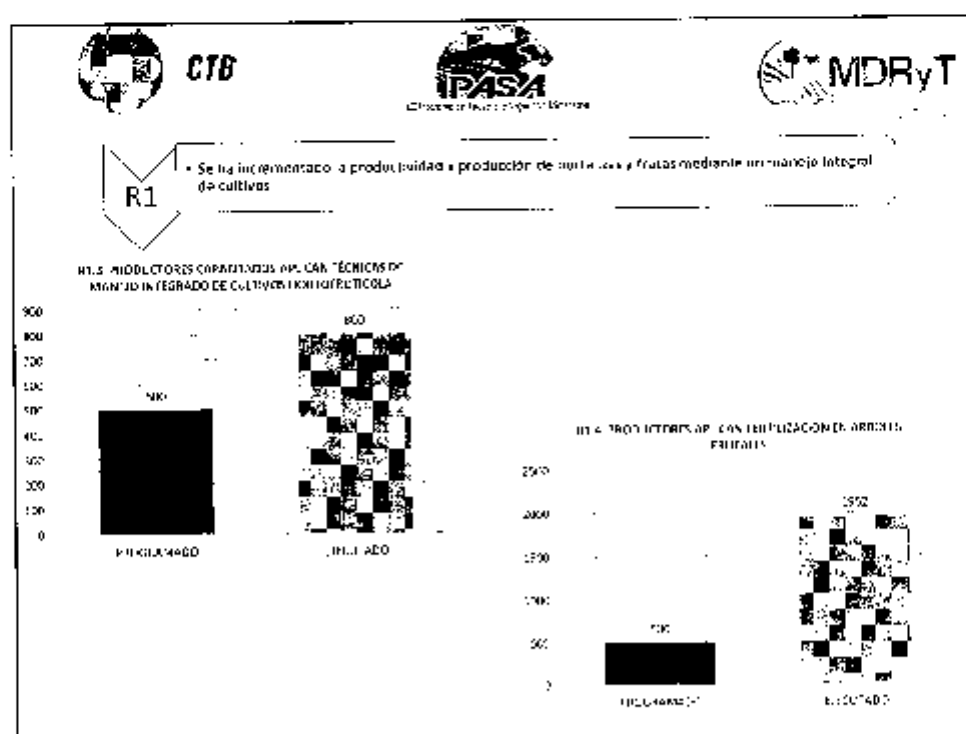
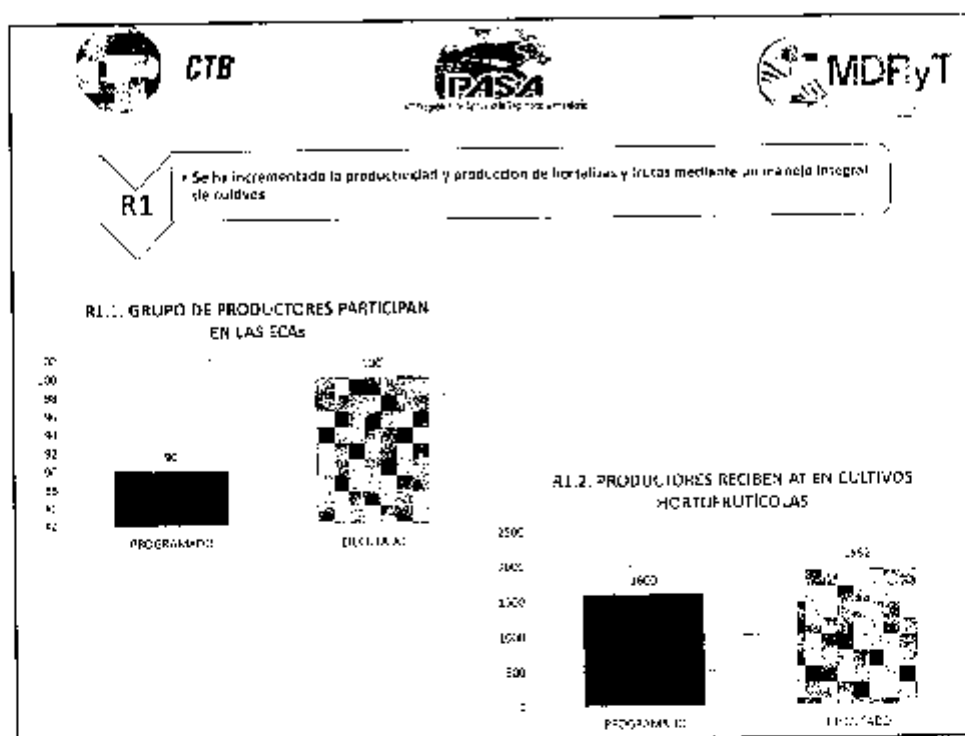


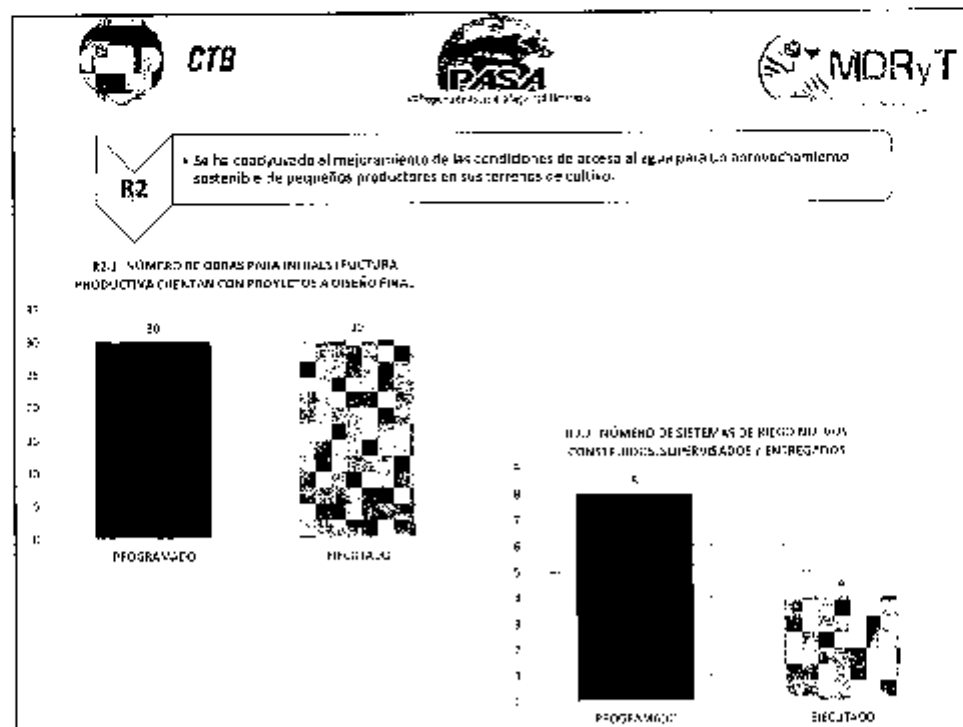
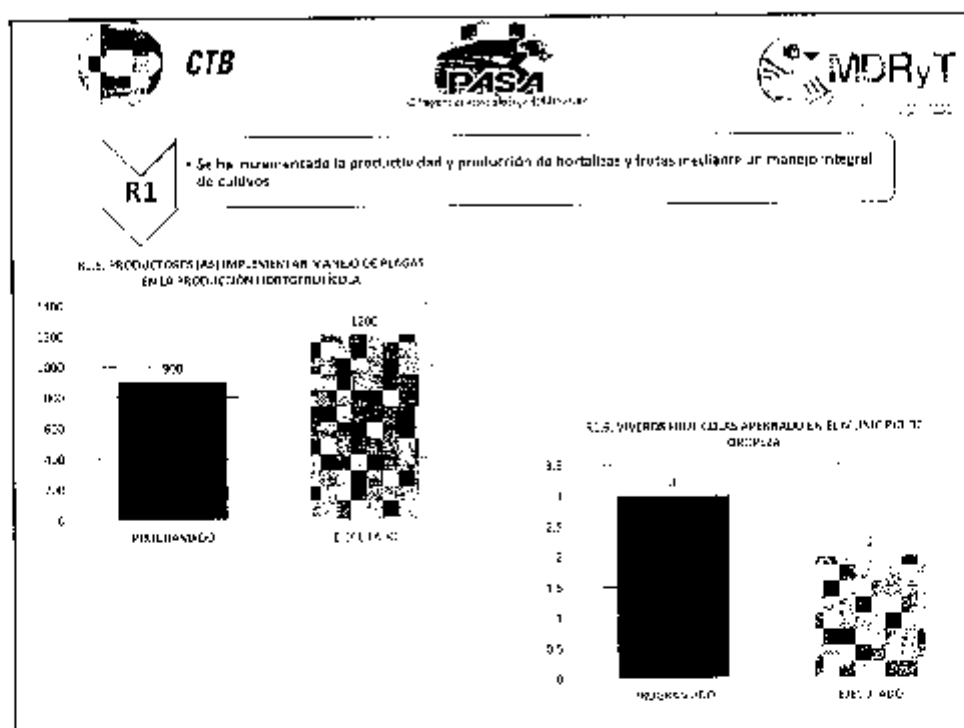


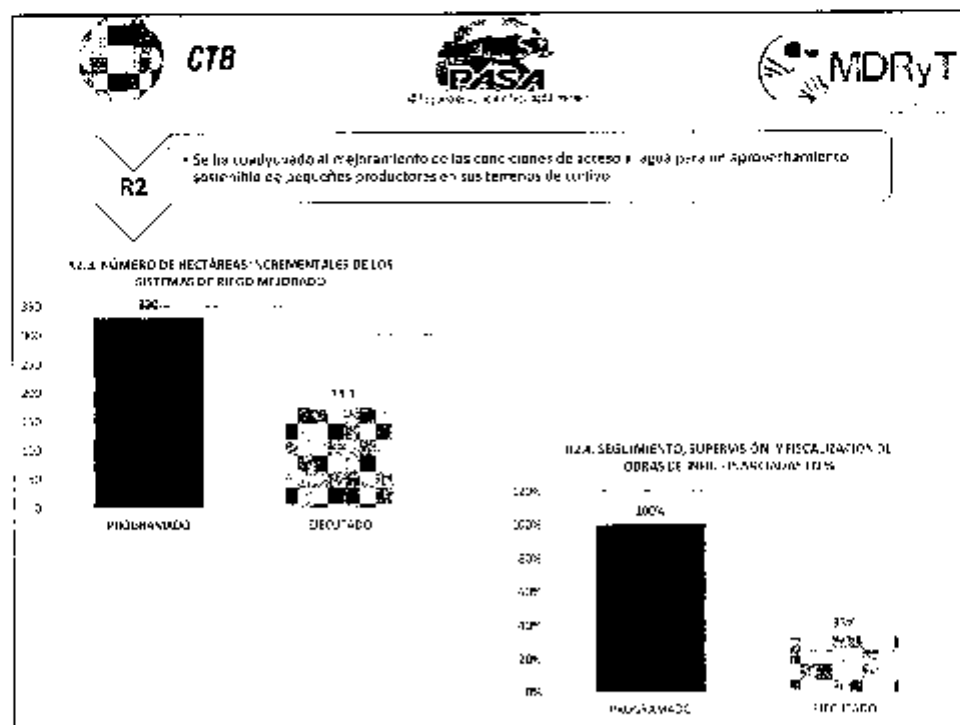
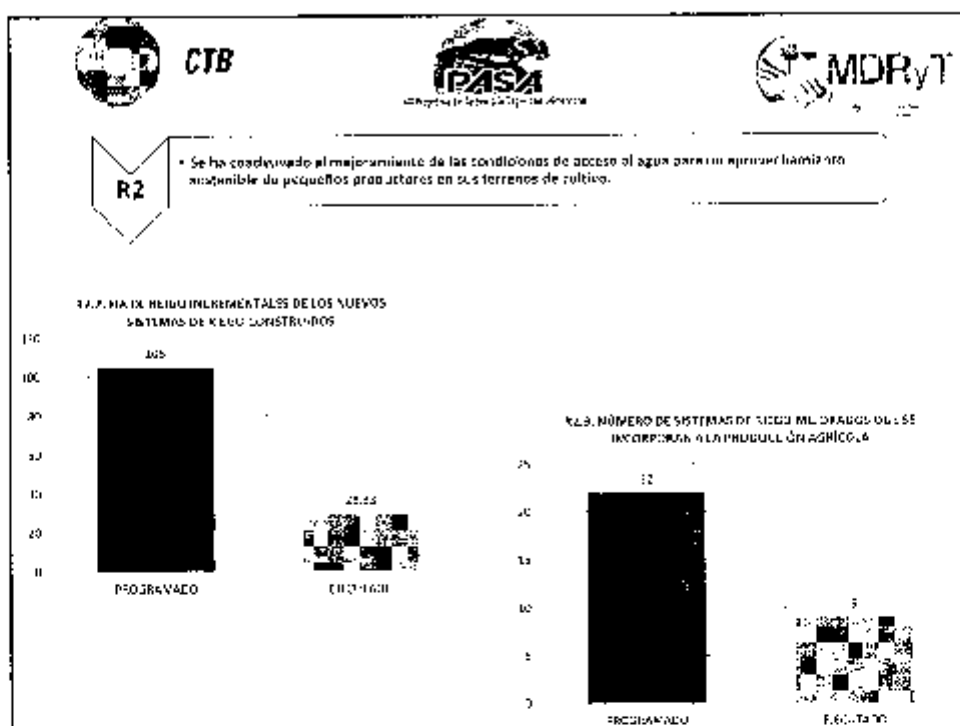


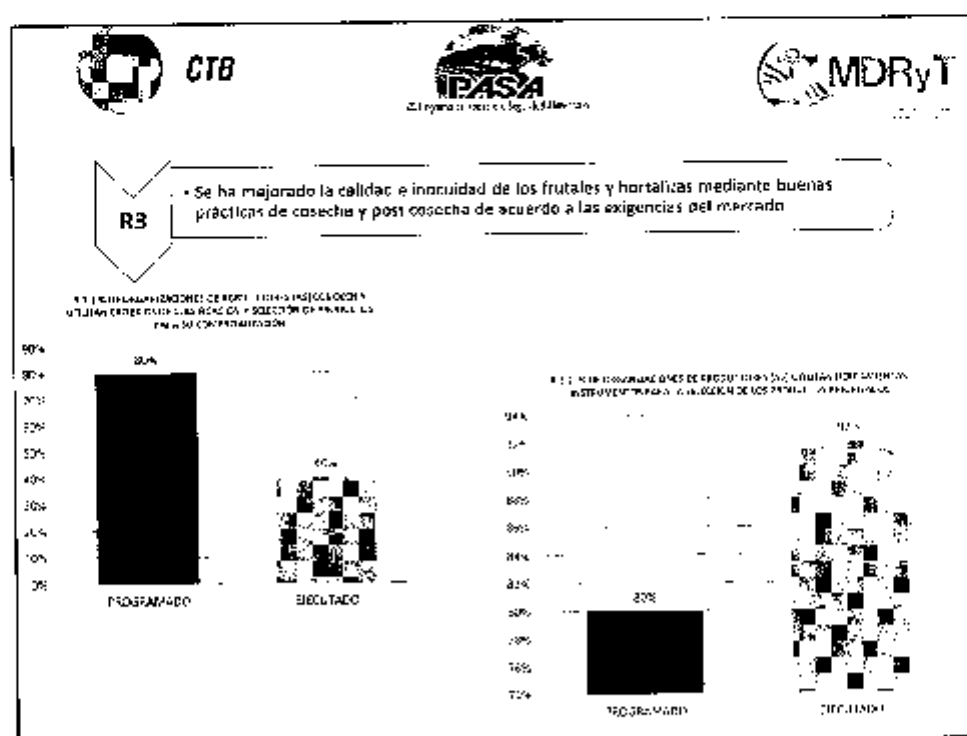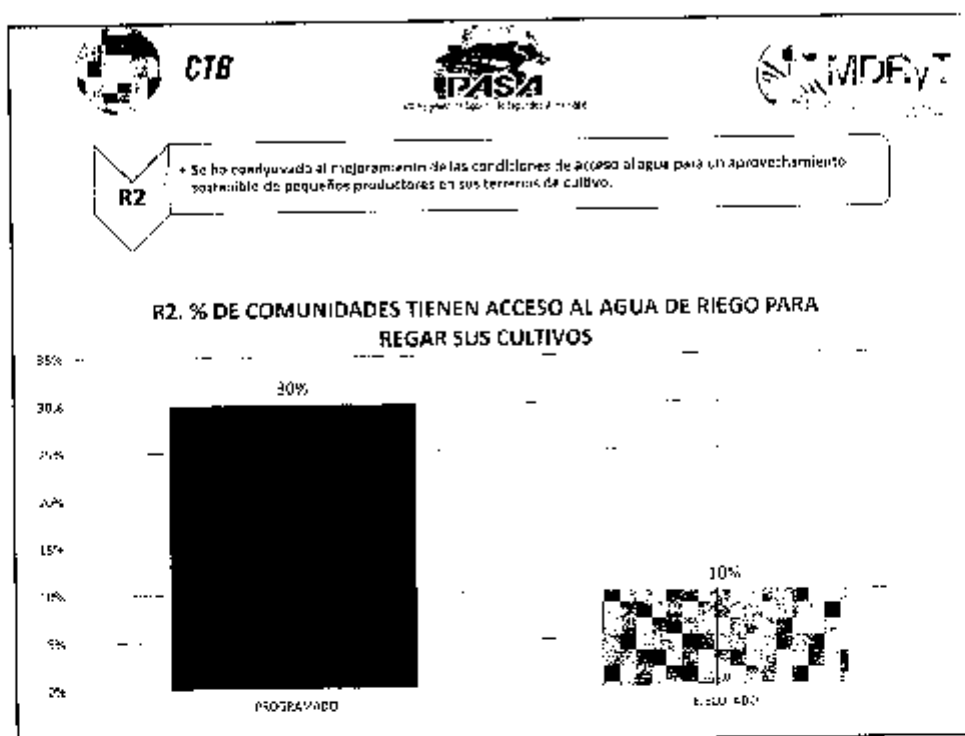


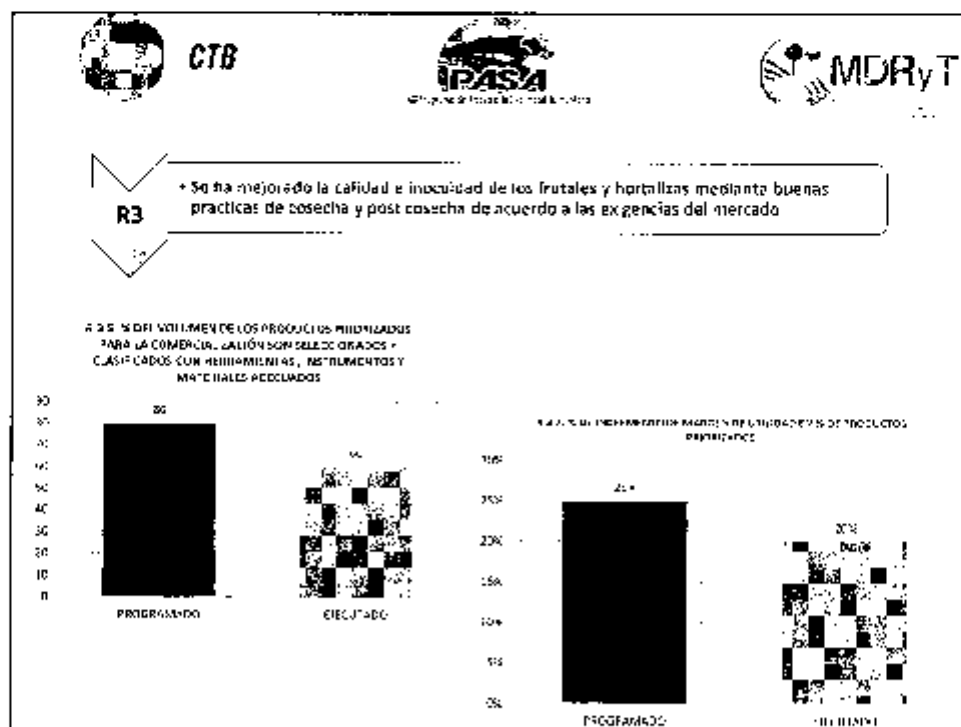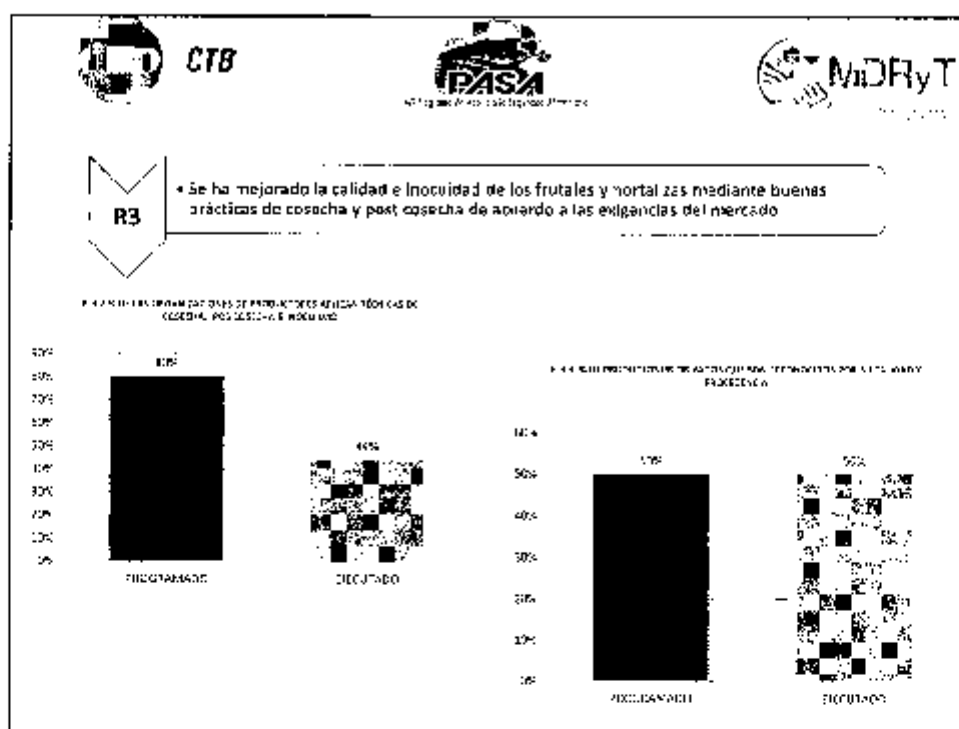


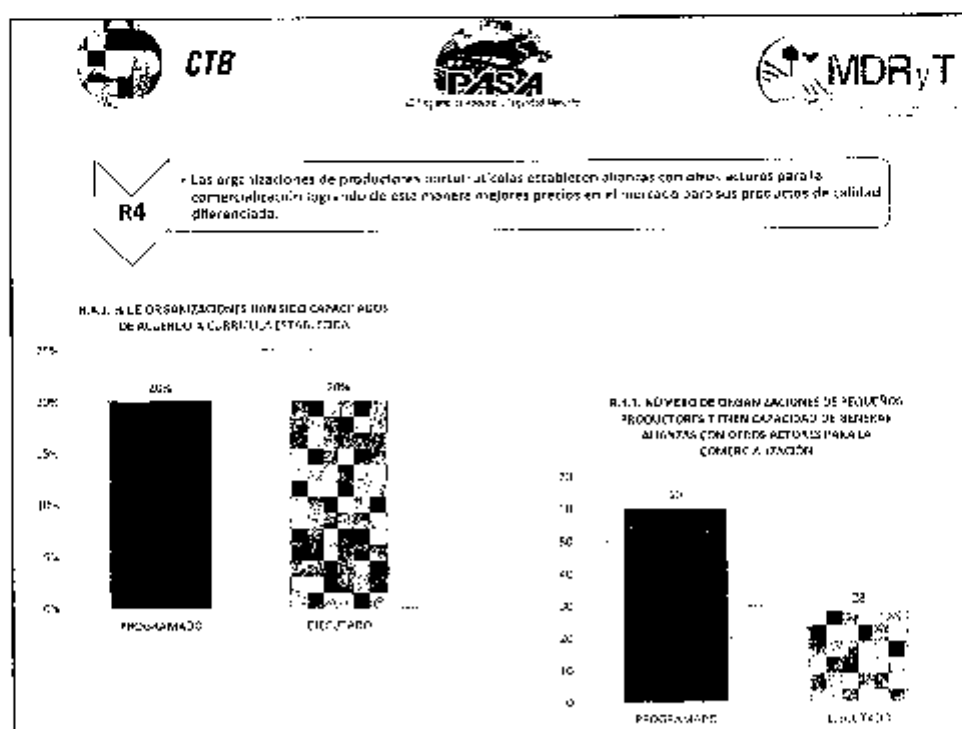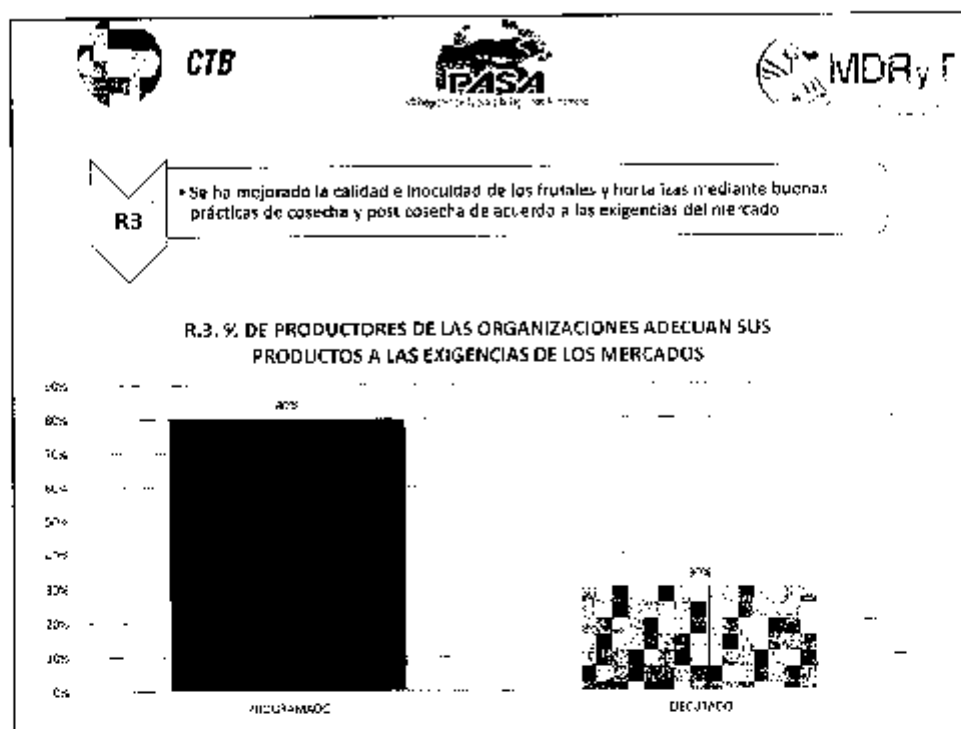

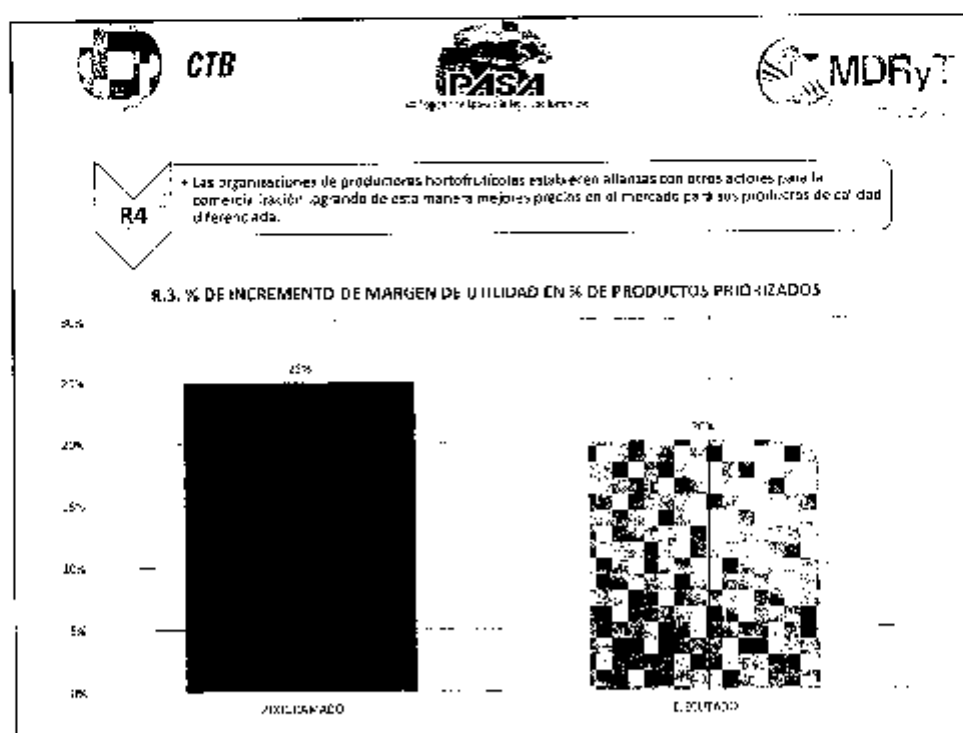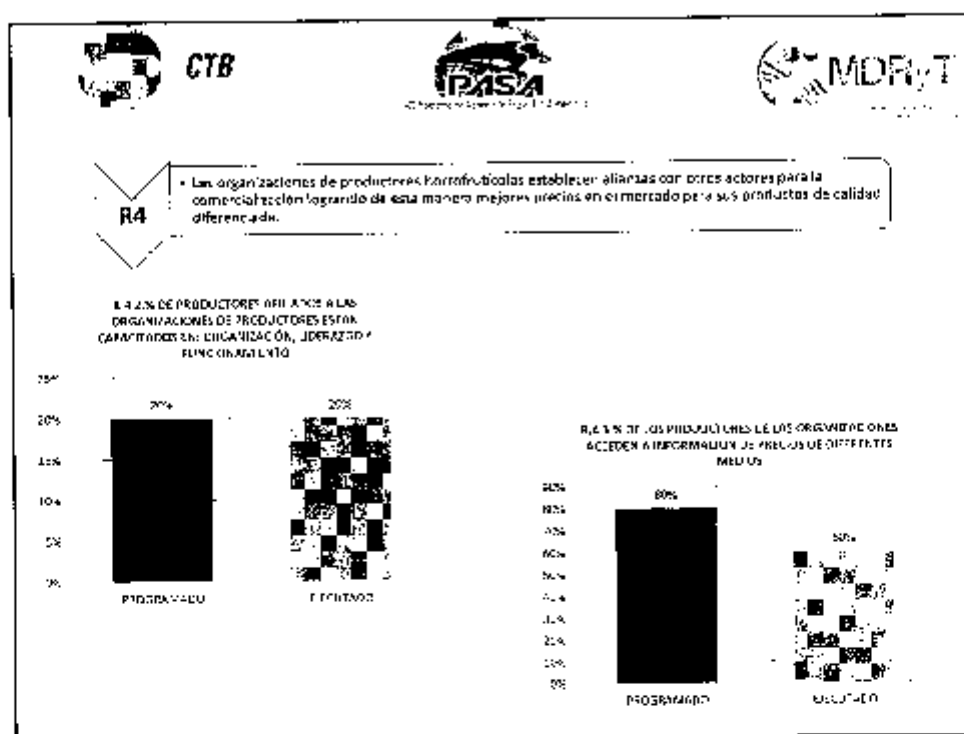

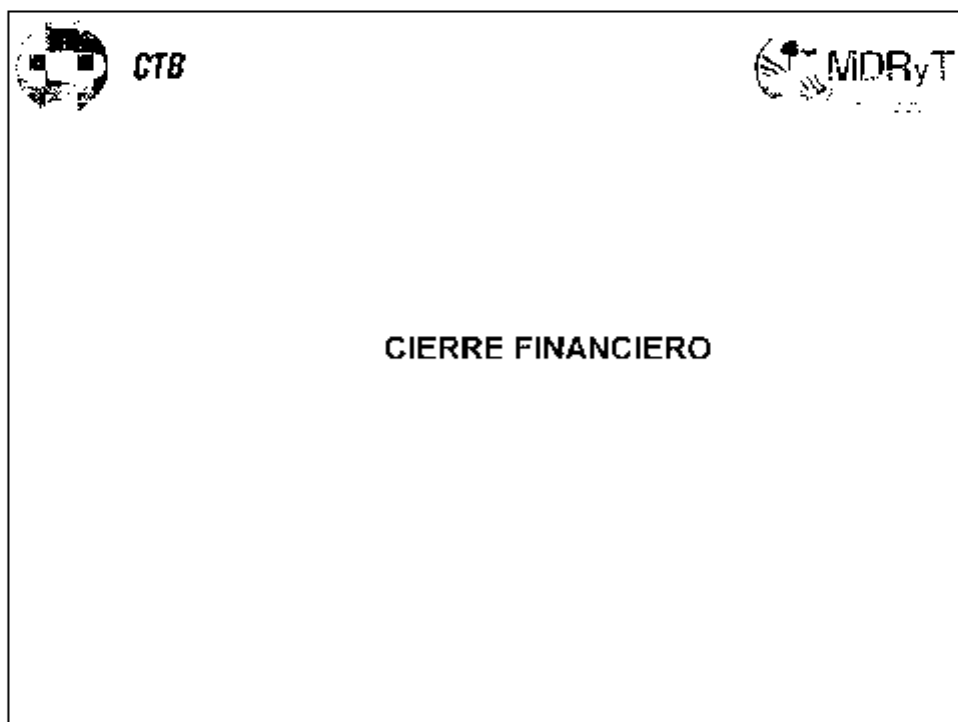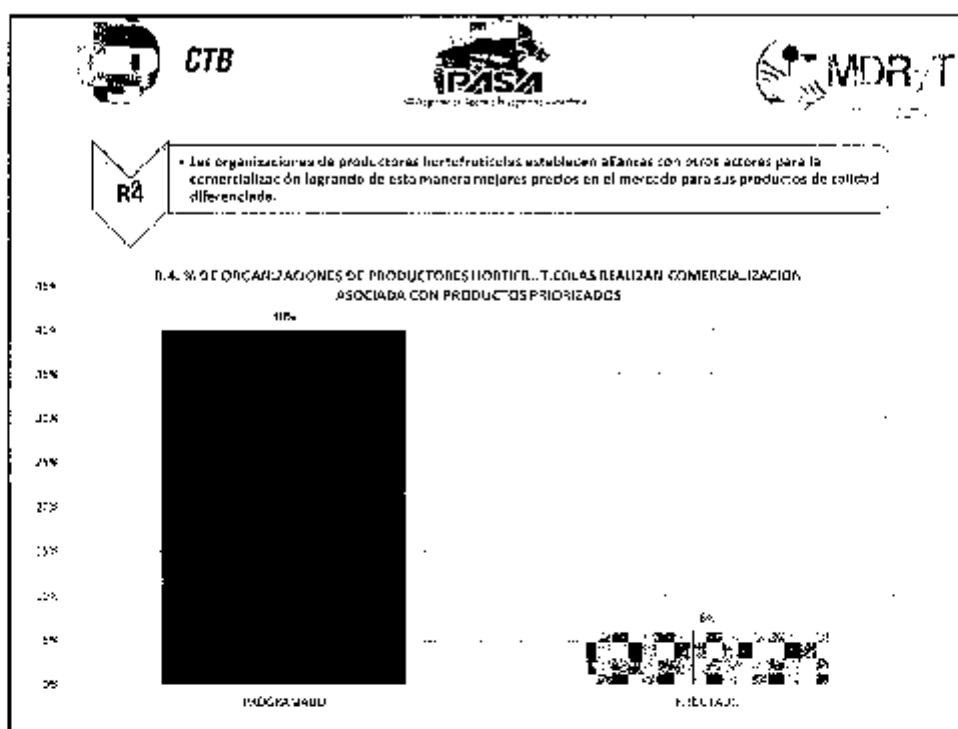

			
ESTADO DE ULTIMOS DESEMBOLSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO EN BS			
CONCEPTO	IMPORTE EN Bs.		
MONTIO PLAN FINANCIERO APROBADO EN BS (NO INCLUYE PRESUPUESTO ADICIONAL SOLICITADO POR BS 50.000)	8,087,314.23	100 %	
DESEMBOLSO DE 10.10.12	5,343,581.98	66 %	
SALDO POR DESEMBOLSAR	260.000 €		
EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO A LA FECHA 26.11.12 (SOBRE EL ÚLTIMO DESEMBOLSO)	5,005,259.00	94%	
EJECUCIÓN SOBRE PAGO PAGADO EN BS (SOBRE EL ÚLTIMO DESEMBOLSO)	6,727,885.92	126%	
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 EN BS: 23.227.359.00		100 %	
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 26.11.12 EN BS: 9.714.701,13		42 %	

				
EJECUCIÓN DE CONTRAPARTES EN US\$				
Contraparte	Contraparte Comprometida (US\$)	Contraparte Ejecutada (US\$)	Porcentaje	Observaciones
Costa Rica	738.000	125.135	17 %	El fondo nacional de la COT 2012 debe ser entregado a la Aduana de Costa Rica para el pago de la deuda.
Brasil	854.000	217.304	25 %	El fondo de la COT 2012 debe ser entregado a la Aduana de Brasil para el pago de la deuda.
Argentina	748.000	0	0 %	El fondo de la COT 2012 debe ser entregado a la Aduana de Argentina para el pago de la deuda.



AUDITORIA EXTERNA DEL PROCAPAS

En la primera semana del mes de noviembre del 2012, la empresa Delta Consult Ltda, realizó la auditoria externa con corte al 1 de noviembre del 2012.

Al presente, existe un informe preliminar con dictamen de auditoria en limpio.

En consecuencia, se prevé tener la versión final hasta el 20.12.12, documento que será remitido a los miembros de la EMCL .



CTB



Chapismo de Empleo y la Seguridad Social



MDRYT

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

CIERRE LEGAL



CTB



1.- REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

AVANCE

279 procesos de
contratación
correspondientes a las
gestiones:

2009
2010
2011
2012

revisados y sistematizados

- Servicios
generales
- Consultorías
- Bienes
- Obras

ACTIVIDADES Foliación, Rotulación y Archivo de procesos de la
PENDIENTES gestión 2011 hasta 07/12/2012



CTB



2.- REGISTRO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVANCE

Gestión	Nº de Contratos Registrados en la C.G.E.
2009	10
2010	38
2011	101
2012	130
TOTAL	279

ACTIVIDADES Remisión de documentación pendiente a la
PENDIENTES C.G.E. en medio físico hasta el 05/12/2012



CTB



3.- TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS, BIENES Y OBRAS APROBADOS

POR LA 18va EMCL

AVANCE	14 RESOLUCIONES firmadas por los miembros titulares de la EMCL que disponen la transferencia de:
E	• 2 camionetas • 3 motocicletas • 1 lavadora de zanahoria • 10 obras de microiriego.
ACTIVIDADES	10 RESOLUCIONES de disposición para la transferencia de bienes <u>que figuran como activos</u>
ES	<u>fixos, adquiridos para determinados municipios</u>
PENDIENTE	<u>beneficiarios del PROCAPAS.</u>
S	



CTB



4.- PRESENTACIÓN DE ACTAS DE TRANSFERENCIA

AVANCE	Formato de actas en elaboración
ACTIVIDADES	Elaboración y presentación de actas para
PENDIENTES	transferencia de Activos Fijos, Bienes y Obras a los municipios y VDRA hasta 10/12/12

5.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL

AVANCE	Actividad posterior a la conclusión de todas las actividades
ACTIVIDADES	Elaboración y presentación del <u>INFORME FINAL</u>
PENDIENTES	<u>con detalle de todos los documentos legales generados, durante la vigencia del PROCAPAS hasta el 17/12/12</u>




ACTIVIDADES DE CIERRE ESPECIFICAS

SE CUENTA CON LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
...\\CONSULTORIAS\\evaluacion socioeconomica\\EVALUACION 2ppt.pptx



SE CUENTA CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCAPAS
...\\CONSULTORIAS\\sistematizacion\\Presentación sistematización 2.pptx

SE CUENTA CON LA GEOREFERENCIACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCAPAS
...\\CONSULTORIAS\\SIG\\SIG PROCAPAS V2.pptx





**GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**

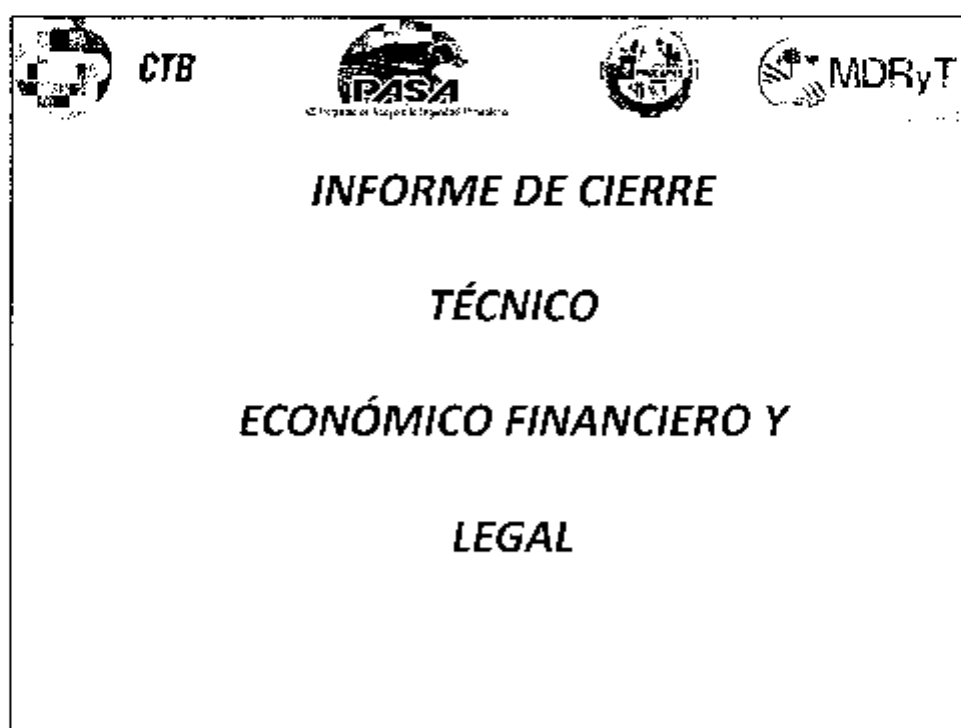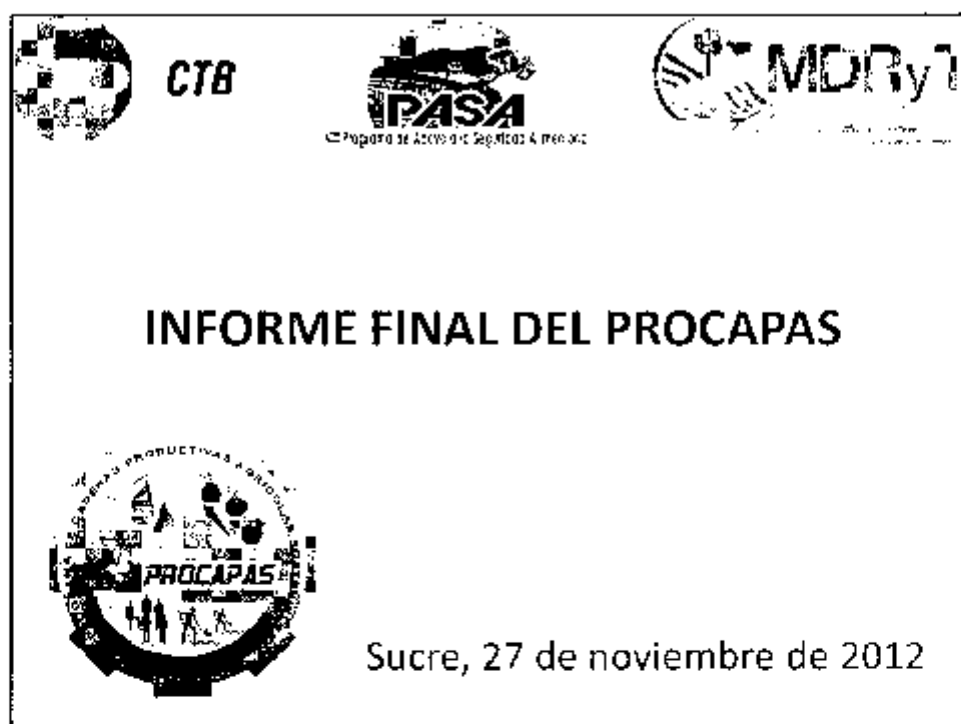





CIERRE

TÉCNICO





OBJETIVOS - RESULTADOS

Coadyuvar al incremento de ingresos, empleo de la población rural de las provincias Orientales, incrementar el volumen de venta, el margen de utilidad y diferenciar a productores.

R1	Se ha incrementado la productividad y producción de hortalizas y frutas mediante un manejo integral de cultivos.
R2	Se ha coadyuvado al mejoramiento de las condiciones de acceso al agua para un aprovechamiento sostenible de pequeños productores en sus terrenos de cultivo.
R3	Se ha mejorado la calidad e inocuidad de los frutales y hortalizas mediante buenas prácticas de cosecha y post cosecha de acuerdo a las exigencias del mercado.
R4	Las organizaciones de productores hortofrutícolas establecen alianzas con otros actores para la comercialización logrando de esta manera mejores precios en el mercado para sus productos de calidad diferenciada.

